



COMITÊ DE BACIA
HIDROGRÁFICA | BAIXO
PARAIBA DO SUL
E ITABAPOANA

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA

ANO 2 - 2023

PIRH-PS


Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul



março, 2024

PAINEL


Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

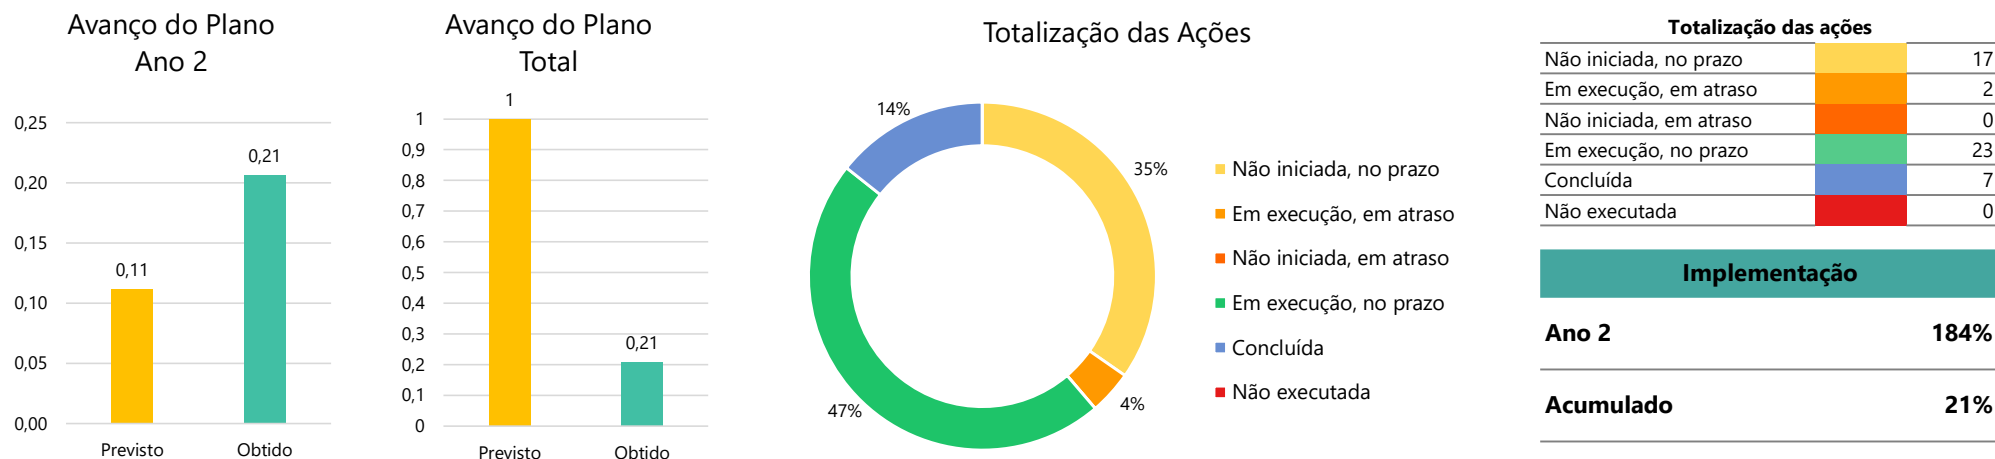

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
	1.1 - Fortalecimento Institucional	1.1.1 - Compatibilização dos Interesses Internos e Externos da Região Hidrográfica	1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,13	0,13				
			1.1.1.2 - Criar e manter Grupo de Trabalho para discussão da transposição do rio Macabu (RH-IX e RH-Macaé)	0,25	0,25						
		1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê	1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê	0,00	0,00	0,00	0,10				
			1.1.2.2 - Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos	0,00	0,00						
			1.1.2.3 - Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH	0,00	0,00						
		1.1.3 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária	1.1.2.4 - Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão GACG	0,00	0,00	0,19	0,25				
			1.1.2.5 - Manter a interação com as prefeituras da área de abrangência da RH-IX, com foco em divulgar as ações do PBH e integrar os entes dos sistemas	0,00	0,50						
			1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia	0,00	0,00						
			1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão	0,75	1,00						

PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

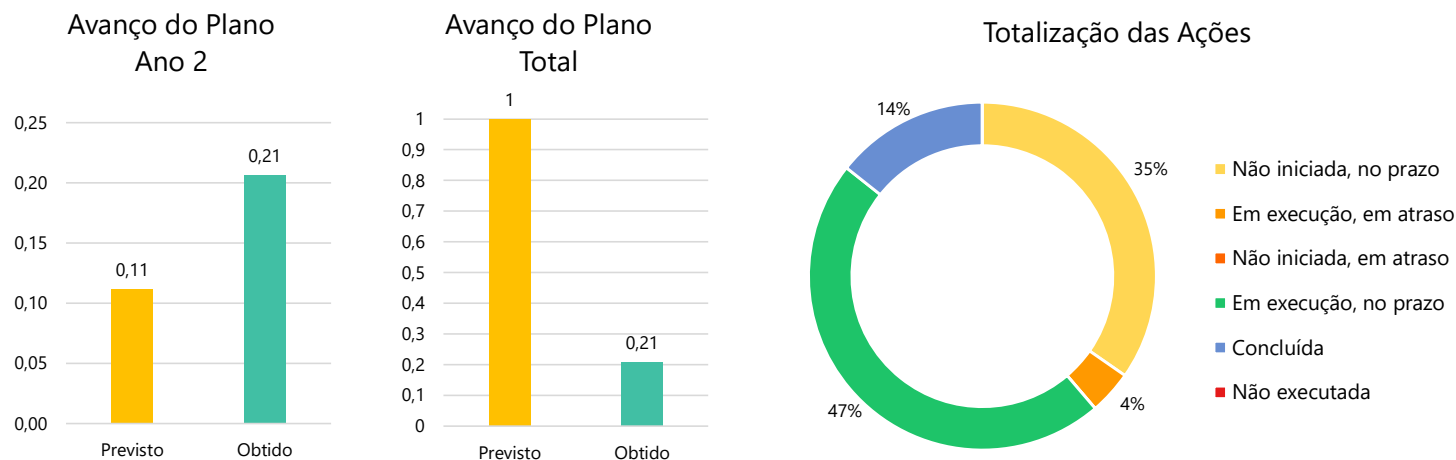




Totalização das ações		
Não iniciada, no prazo		17
Em execução, em atraso		2
Não iniciada, em atraso		0
Em execução, no prazo		23
Concluída		7
Não executada		0

Implementação	
Ano 2	184%
Acumulado	21%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
1 - Gestão de Recursos Hídricos	1.2 - Instrumentos de Gestão	1.2.1 - Outorga	1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão	0,00	0,00						
			1.1.3.4 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas a recursos hídricos	0,00	0,00						
			1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica	0,50	0,25	0,25	0,13				
			1.2.1.2 - Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH IX	0,00	0,00					0,10	0,12
			1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão	0,25	0,50	0,25	0,50				
			1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento	0,75	0,75	0,38	0,38				
	1.2 - Instrumentos de Gestão	1.2.4 - Plano de Bacia	1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação	0,00	0,00						
			1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano	0,00	0,00			0,19	0,20		
			1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do orçamento, a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir 12º ano.	0,00	0,00						
			1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH	0,00	0,00						
		1.2.4.4 - Complementar as informações de diagnóstico, prognóstico, diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais itens do PBH para a região da bacia do Itabapoana	0,50	0,00	0,08	0,00					

PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

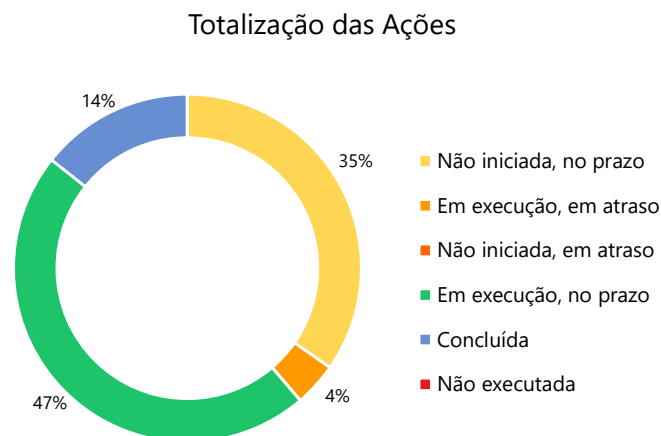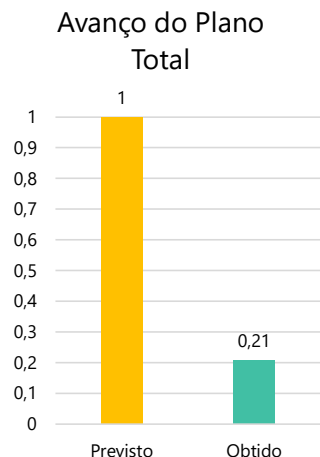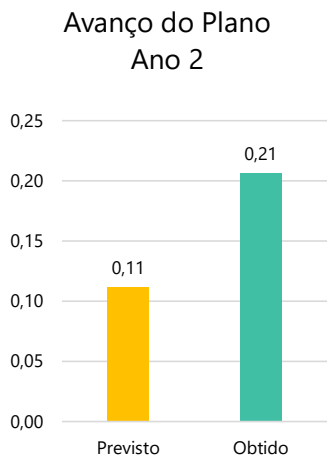

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	17
Em execução, em atraso	2
Não iniciada, em atraso	0
Em execução, no prazo	23
Concluída	7
Não executada	0


Implementação

Ano 2	184%
Acumulado	21%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
			1.2.4.5 - Definir área das Lagoas da RH IX e elaborar plano de trabalho para o desenvolvimento dos Planos de Manejo de Usos Múltiplos de Lagoa ou Laguna (PMULs), em conjunto com o órgão gestor	0,00	0,00						
			1.2.4.6 - Desenvolver as propostas de PMULs em conformidade ao plano de trabalho elaborado	0,00	0,00						
			1.2.5 - Sistema de Informações	1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH IX e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.3 - Unidades Especiais de Gestão (UEGs)	1.3.1 - Criação de UEGs e Indicação de Manejos Diferenciados	1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.4.1 - Plano de Gerenciamento de Risco	1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.4.2 - Ações emergenciais	1.4.2.1 - Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1 - Água Superficial	2.1.1 - Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-quantitativo		2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	0,00	0,00						
			2.1.1.2 - Realizar estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quantitativo e proposição de soluções com foco na bacia hidrográfica do rio Macabu, incluindo elaboração de Manual Operativo do sistema	0,00	0,00	0,31	0,25	0,31	0,25		
			2.1.1.3 - Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas regiões afetadas	0,50	0,00						

PAINEL


Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

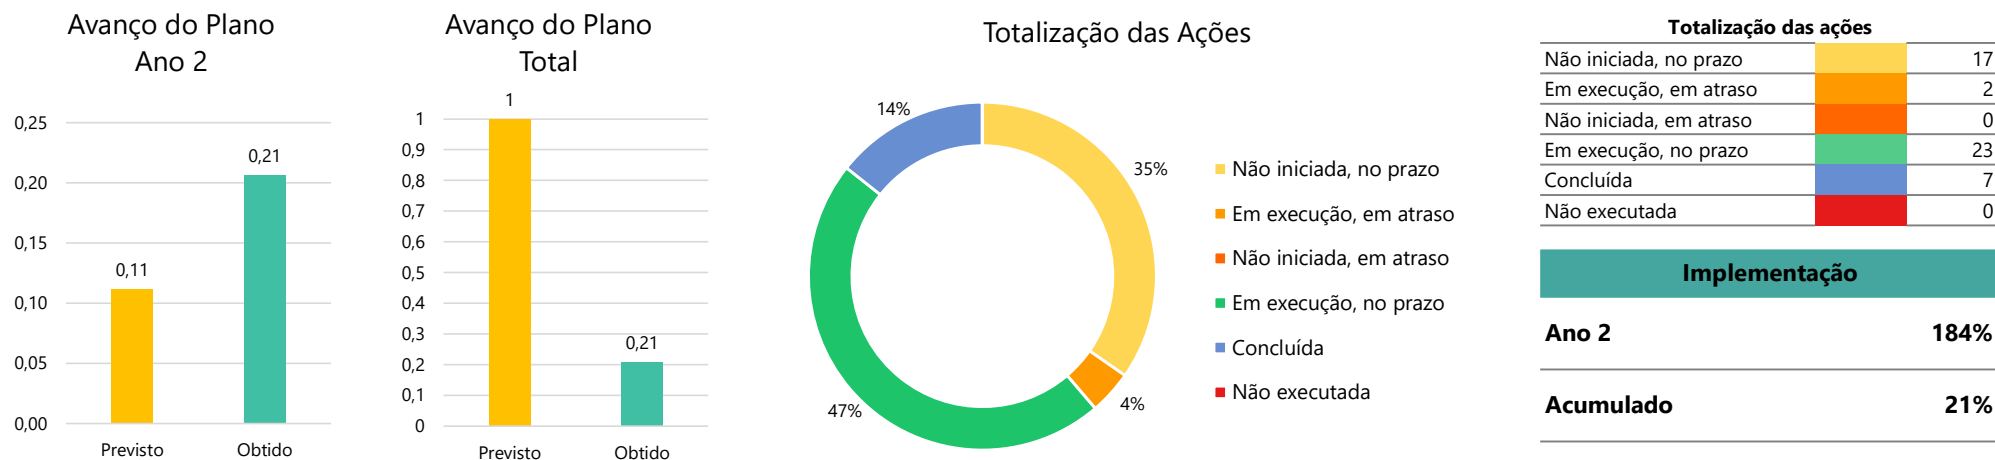

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global			
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido		
2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo	2.2 - Água Subterrânea		2.1.1.4 - Subsidiar os estudos sobre os canais da baixada campista	0,75	1,00								
			2.2.1 - Uso Sustentável da Água Subterrânea	2.2.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo sobre a água subterrânea na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00			0,20	0,19	
			2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente	2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente	0,00	0,00			0,00	0,00			
				2.3.1.2 - Realizar a operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativa existente sob responsabilidade do comitê	0,00	0,00					0,08	0,13	
			2.3.2 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa	2.3.2.1 - Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH IX	0,00	0,00			0,25	0,38			
		2.3.2.2 - Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI	0,50	0,75									
3 - Saneamento Urbano e Rural	3.1 - Esgotamento Sanitário	3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário	0,00	0,50								
			3.1.1.2 - Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17				
			3.1.1.3 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)	0,00	0,00							0,00	0,06
	3.2 - Resíduos Sólidos	3.2.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento das Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos	3.2.1.1 - Viabilizar relatório sobre resíduos sólidos para divulgação aos órgãos pertinentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PAINEL




Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

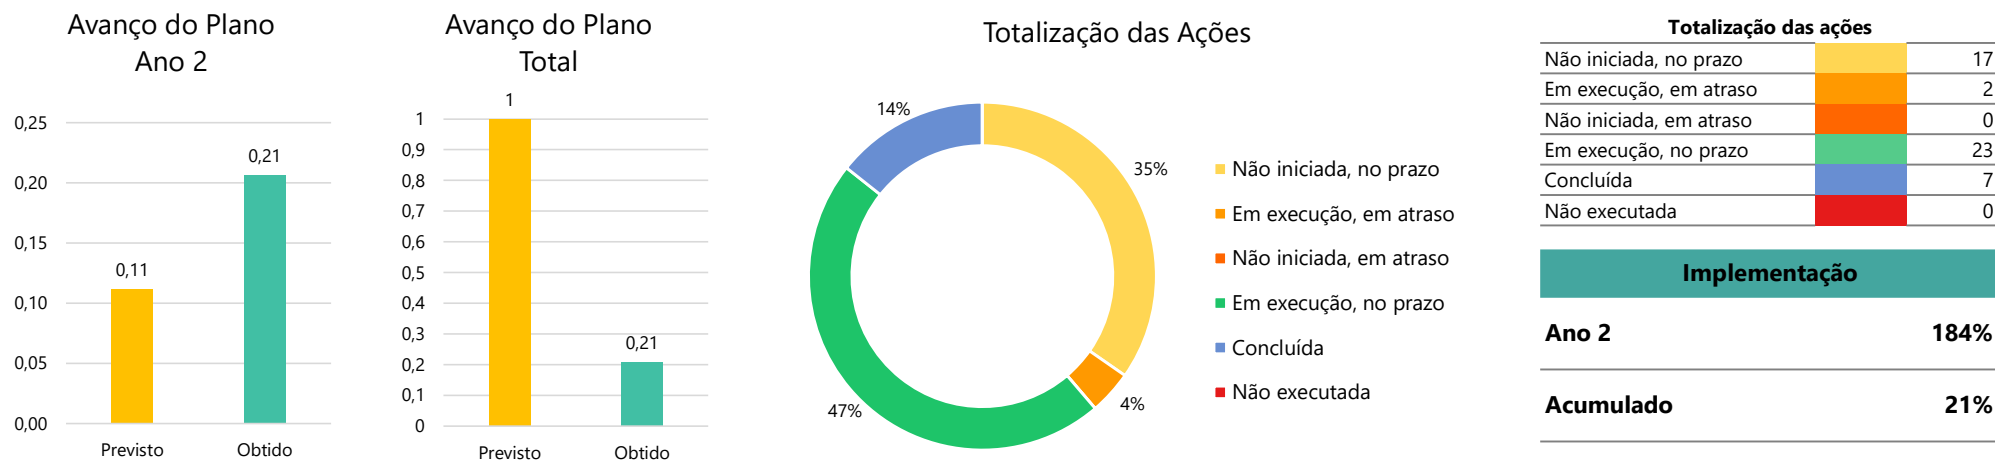

Avaliação quantitativa					Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	
	3.3 - Drenagem Urbana	3.3.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana	3.3.1.1 - Viabilizar relatório sobre drenagem urbana para divulgação aos órgãos pertinentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 - Infraestrutura verde	4.1 - Planejamento Territorial	4.1.1 - Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	4.1.1.1 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	1,00	1,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,38	0,88	
			4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos	0,00	1,00							
			4.1.2 - Mobilização Social visando à Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias	0,00	1,00	0,00	1,00					
	4.2 - Intervenções na Paisagem	4.2.1 - Restauração e Conservação de Bacias Hidrográficas e reabilitação de corpos hídricos	4.2.1.1 - Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos	0,50	0,75	0,50	0,75	0,50	0,75			
5 - Produção de conhecimento	5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico	5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico, Pesquisa e Extensão	5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.1.2 - Elaboração de Estudos Técnicos	5.1.2.1 - Realizar estudo sobre o recuo da linha de costa na região de Atafona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 - Comunicação e	6.1 - Comunicação	6.1.1 - Gestão de Comunicação	6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAINEL

Avaliação de desempenho da implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

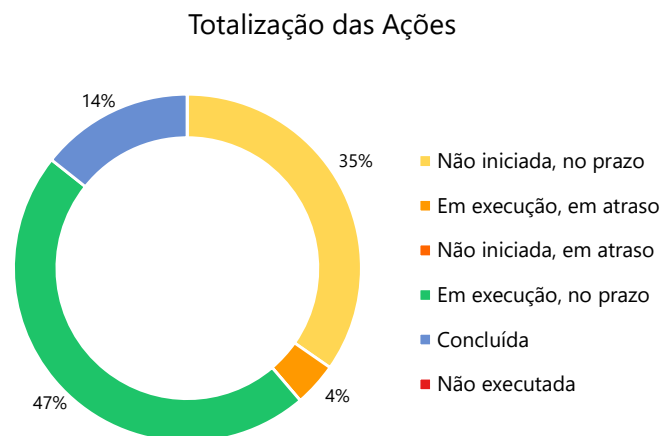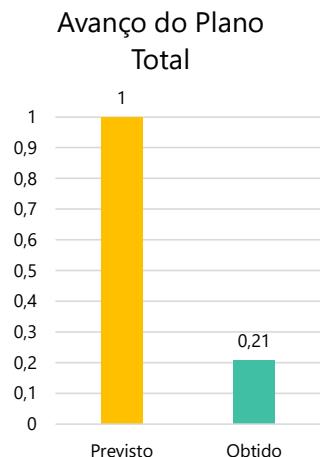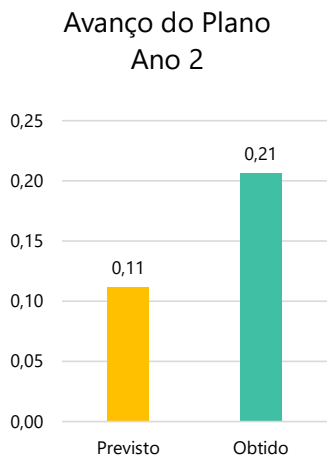

Totalização das ações

Não iniciada, no prazo	17
Em execução, em atraso	2
Não iniciada, em atraso	0
Em execução, no prazo	23
Concluída	7
Não executada	0

Implementação

Ano 2	184%
Acumulado	21%

Avaliação quantitativa				Índice ação		Índice programa		Índice subagenda		Índice global	
Agenda	Subagenda	Programa	Ação	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido	Previsto	Obtido
Educação Ambiental			6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação	0,00	0,00					0,00	0,00
	6.2 - Educação Ambiental	6.2.1 - Educação Ambiental	6.2.1.1 - Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


Ação 1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.1 - Compatibilização dos Interesses Internos e Externos da Região Hidrográfica
Meta	Participação em, ao menos, 70% das reuniões nas quais o CBH possui cadeira
Atividades previstas	Participar das reuniões e propor encaminhamentos Executar os encaminhamentos
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Participar das reuniões e propor encaminhamentos Executar os encaminhamentos		
Principais constatações	O Comitê vem participando das instâncias de integração de forma constante, cabendo destacar os Grupos de Trabalho do Itabapoana e da transposição do Macabu, bem como o Grupo de Trabalho Enquadramento.		
Recomendações	-		

Ação 1.1.1.1 - Participar nas instâncias de integração e articulação do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma participação realizada	2023	0	0
70% de participação durante quatro anos	2025	0,25	
70% de participação durante oito anos	2029	0,5	
70% de participação durante doze anos	2033	0,75	
70% de participação em todos os anos da vigência do PBH	2036	1	

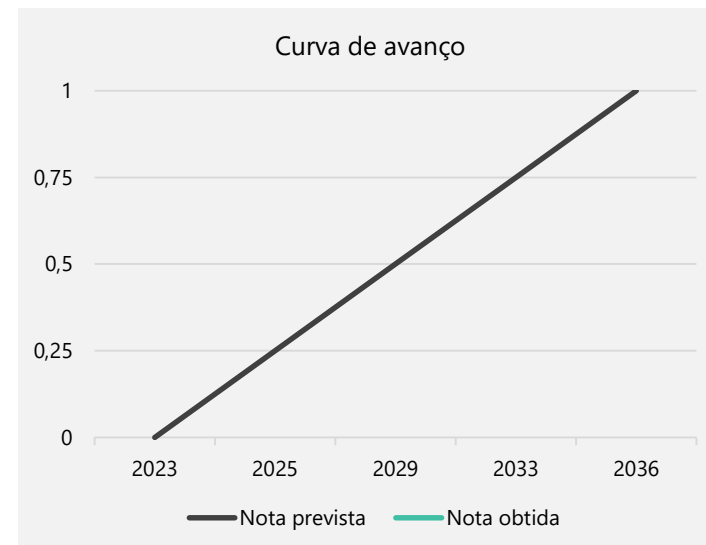


Ação 1.1.1.2 - Criar e manter Grupo de Trabalho para discussão da transposição do rio Macabu (RH-IX e RH-Macaé)

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.1 - Compatibilização dos Interesses Internos e Externos da Bacia
Meta	Elaboração e publicação de resolução conjunta
Atividades previstas	Convocar os atores pertinentes para a criação do Grupo de Trabalho
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,25	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	Reuniões para discutir a transposição do rio Macabu		
Principais constatações	Grupo de Trabalho criado. As reuniões vêm sendo realizadas para discussão da temática, com participação do órgão gestor.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
2 reuniões realizadas	2023	0,25	0,25
1 oficina realizada	2024	0,5	
minuta de resolução elaborada	2025	0,75	
resolução conjunta publicada	2027	1	

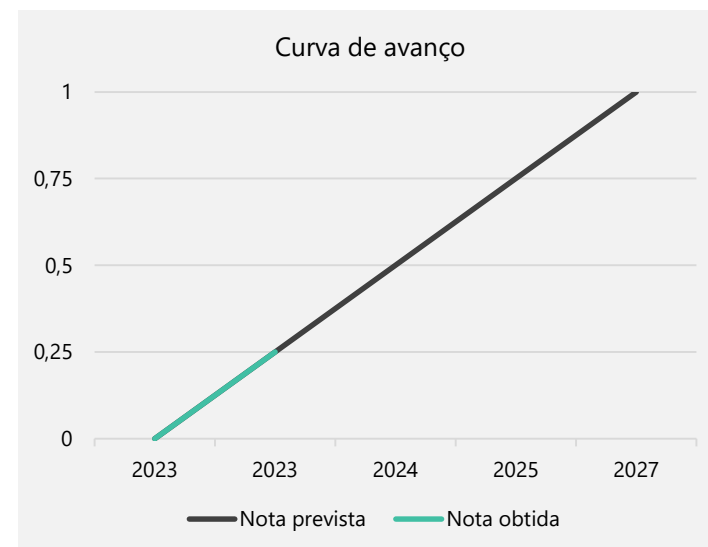


Ação 1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Viabilização de 100% das solicitações de participação em eventos internos e externos
Atividades previstas	Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 750.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Custeio das atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.1.2.1 - Custear as atividades do Comitê (diárias, reembolsos, passagens, ajuda de custo) e outras despesas relacionadas à participação e à representação em eventos internos e externos e à realização de eventos do comitê

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma participação realizada	2023	0	0
100% das solicitações viabilizadas durante quatro anos	2025	0,25	
100% das solicitações viabilizadas durante oito anos	2029	0,5	
100% das solicitações viabilizadas durante doze anos	2033	0,75	
100% das solicitações viabilizadas em todos os anos da vigência do PBH	2036	1	

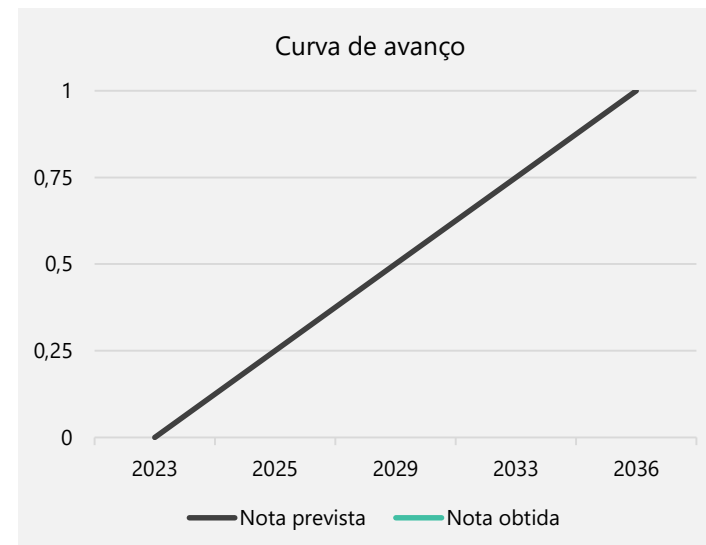


Ação 1.1.2.2 - Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Participação de membros do Comitê em 15 capacitações
Atividades previstas	Organização do Simpósio da Bacia do Rio Paraíba do Sul
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 150.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Organização do Simpósio da Bacia do Rio Paraíba do Sul		
Principais constatações	O Simpósio da Bacia do Rio Paraíba do Sul foi realizado com sucesso e participação dos diversos atores da bacia. Maiores informações podem ser acessadas em: https://www.cbhbaixoparaiba.org.br/IV-simposio-RHBRPS.php		
Recomendações	-		

Ação 1.1.2.2 - Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma participação realizada	2023	0	0
4 capacitações realizadas	2025	0,25	
8 capacitações realizadas	2029	0,5	
12 capacitações realizadas	2033	0,75	
15 capacitações realizadas	2036	1	

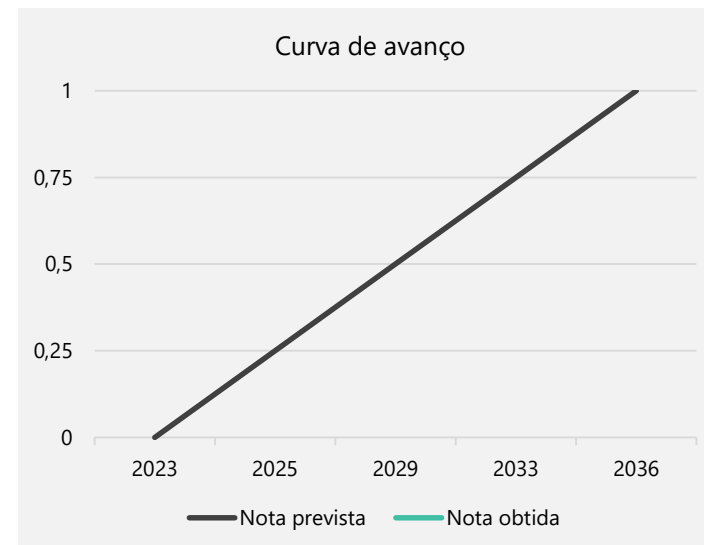


Ação 1.1.2.3 - Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Viabilização, custeio e mantimento do funcionamento do(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH
Atividades previstas	Manter o(s) Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 2.850.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Escritório(s) de Projeto(s) do CBH e estagiários		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum projeto apoiado	2023	0	0
EP em funcionamento durante quatro anos	2025	0,25	
EP em funcionamento durante oito anos	2029	0,5	
EP em funcionamento durante doze anos	2033	0,75	
EP em funcionamento em todos os anos da vigência do PBH	2036	1	

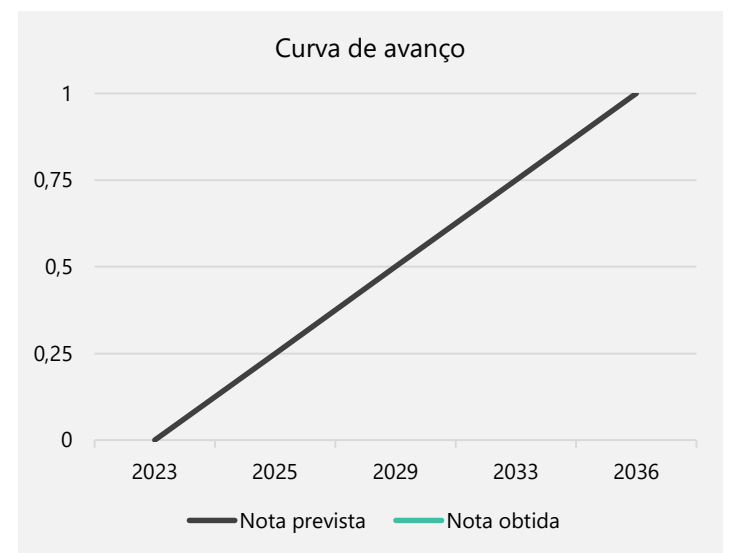


Ação 1.1.2.4 - Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão GACG

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Relatório anual do GACG elaborado e publicado
Atividades previstas	Manter em funcionamento o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG)
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Organização e apoio à realização das reuniões do GACG		
Principais	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
4 relatórios elaborados	2025	0,25	
8 relatórios elaborados	2029	0,5	
12 relatórios elaborados	2033	0,75	
15 relatórios elaborados	2036	1	

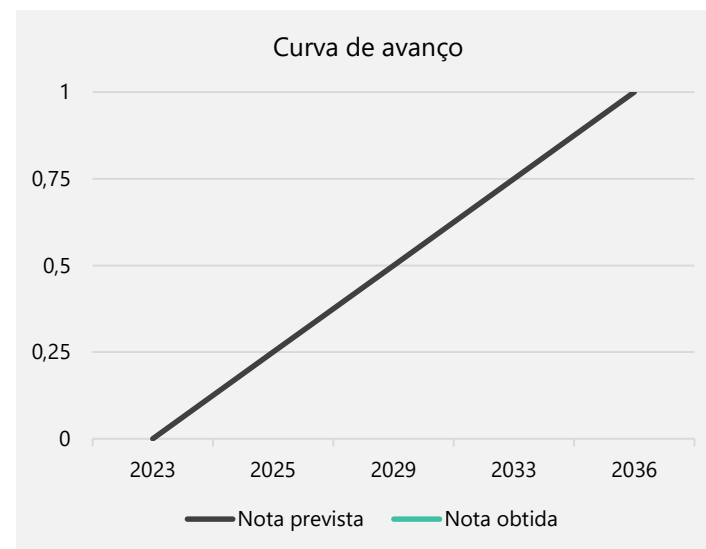


Ação 1.1.2.5 - Manter a interação com as prefeituras da área de abrangência da RH-IX, com foco em divulgar as ações do PBH e integrar os entes dos sistemas

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.2 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações do Comitê
Meta	Realização de 8 reuniões ou atividades com as prefeituras da RH-IX
Atividades previstas	Elaboração de cronograma de visitas da diretoria às prefeituras da RH Primeira rodada de visitas - 11 prefeituras
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,50
Atividades executadas	Visitas e articulação com as prefeituras no âmbito das ações de educação ambiental e saneamento rural.		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
2 reuniões ou atividades realizadas	2025	0,25	
4 reuniões ou atividades realizadas	2029	0,5	
6 reuniões ou atividades realizadas	2033	0,75	
8 reuniões ou atividades realizadas	2036	1	

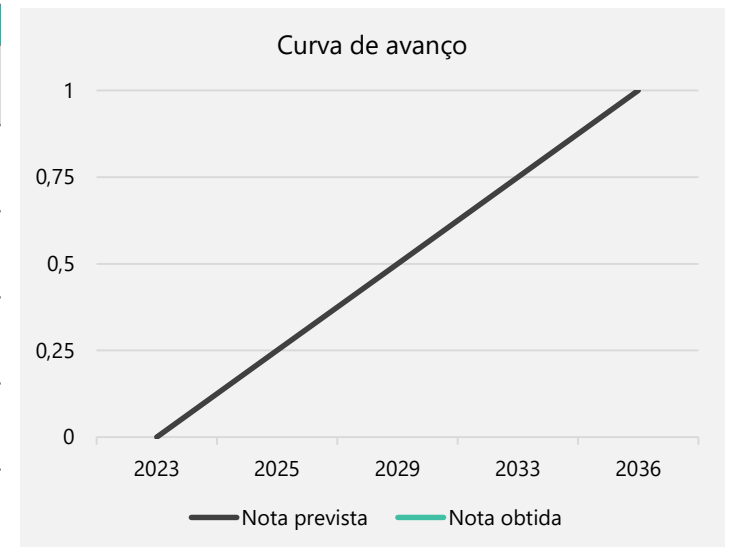


Ação 1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.3 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária
Meta	Viabilização dos recursos financeiros para a manutenção da Entidade Delegatária em cumprimento ao Contrato de Gestão
Atividades previstas	Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 3.900.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.1.3.1 - Viabilizar a manutenção da Entidade Delegatária para execução de ações para atendimento ao Contrato de Gestão e às deliberações do Comitê, conforme definições do Plano de Bacia

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
recurso aportado durante quatro anos	2025	0,25	
recurso aportado durante oito anos	2029	0,5	
recurso aportado durante doze anos	2033	0,75	
recurso aportado em todos os anos da vigência do PBH	2036	1	

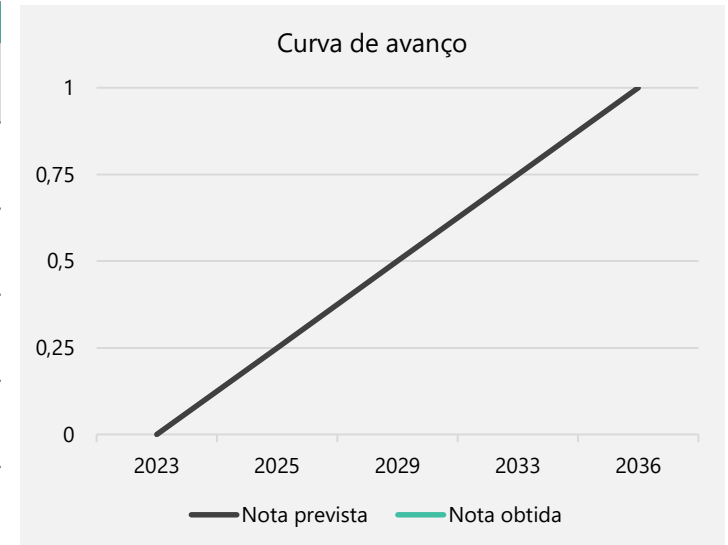


Ação 1.1.3.2 - Realizar revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico de forma que a Entidade Delegatária possa cumprir suas atribuições para cumprimento do Contrato de Gestão

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.3 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária
Meta	Realização da revisão do fluxo de gestão entre o 1º e o 3º ano de vigência do PBH
Atividades previstas	Elaborar as especificações técnicas para a revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégico
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0,75	Nota alcançada	1,00
Atividades executadas	Ação realizada pela Gerência de Gestão Estratégica da AGEVAP		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
especificação técnica para a revisão do fluxo de gestão e planejamento elaborada	2025	0,25	
revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégicos em andamento	2029	0,5	
revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégicos concluída	2033	0,75	
revisão do fluxo de gestão e planejamento estratégicos aprovada	2036	1	

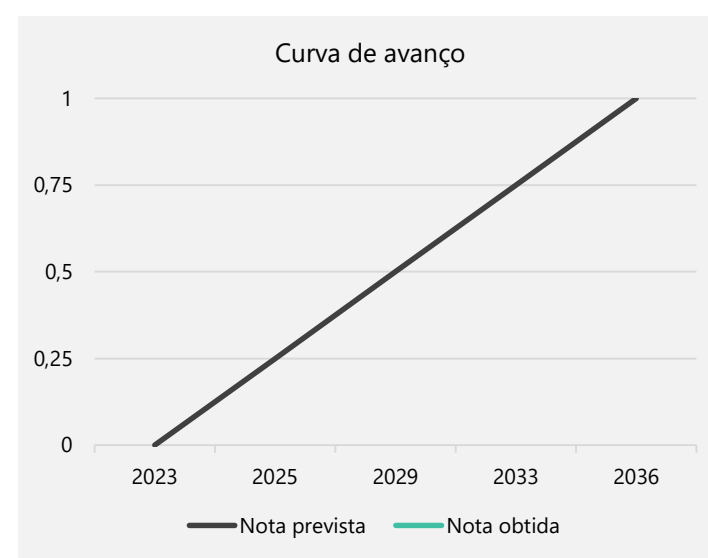


Ação 1.1.3.3 - Ampliar a estrutura física e de pessoal, de acordo com a revisão do fluxo de gestão

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.3 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária
Meta	Avaliação da necessidade e possibilidade de ampliação e manutenção da estrutura da Entidade Delegatária, durante o 4º e 5º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
1ª reunião de alinhamento sobre a avaliação realizada	2025	0,25	
2ª reunião de alinhamento sobre a avaliação realizada	2025	0,5	
avaliação em realização	2026	0,75	
avaliação da necessidade e possibilidade da ampliação e manutenção concluída	2026	1	

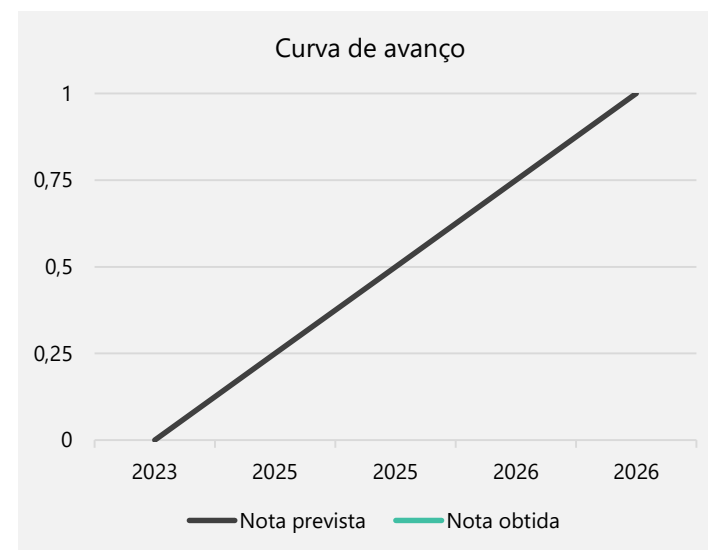


Ação 1.1.3.4 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas a recursos hídricos

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.1 - Fortalecimento Institucional
Programa	1.1.3 - Aprimoramento, fortalecimento e manutenção das ações da Entidade Delegatária
Meta	Realização de 15 participações de colaboradores da Entidade Delegatária em capacitação relacionada a recursos hídricos
Atividades previstas	Realizar constante levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores Definir os colaboradores para participação no evento ou na capacitação Participar dos eventos de treinamento e capacitação Receber o certificado de realização da capacitação Acompanhar a realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Levantamento dos eventos e das capacitações relacionados às atividades desempenhadas pelos colaboradores; definição dos colaboradores para participação no evento ou na capacitação; participação nos eventos de treinamento e capacitação; certificado de realização da capacitação; realização das capacitações, principalmente no que tange ao atendimento das metas do CG		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.1.3.4 - Promover a participação dos colaboradores da Entidade Delegatária em capacitações relacionadas a recursos hídricos

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma participação realizada	2023	0	0
4 participações realizadas	2025	0,25	
8 participações realizadas	2029	0,5	
12 participações realizadas	2033	0,75	
15 participações realizadas	2036	1	

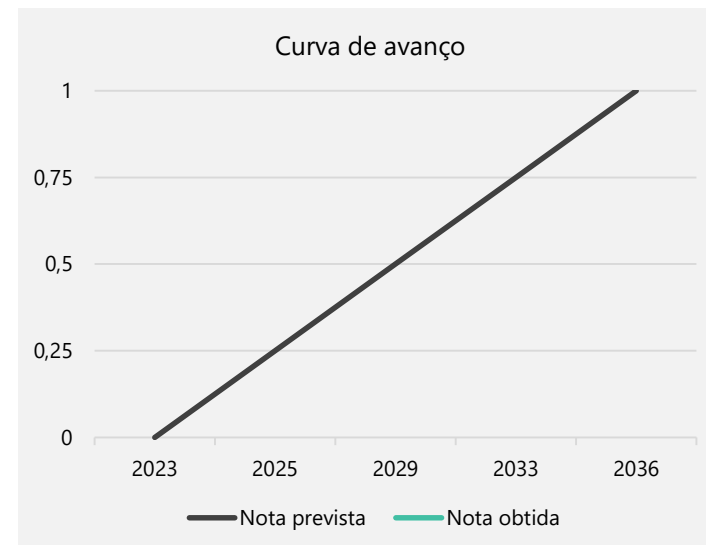


Ação 1.2.1.1 - Discutir as diretrizes definidas para a outorga no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.1 - Outorga
Meta	Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da outorga propostas pelo comitê até o 4º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	Aprovação de Plano de Trabalho para discussão das diretrizes da outorga para execução ser iniciada no 2º ano do PBH
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,50	Nota alcançada	0,25
Atividades executadas	-		
Principais constatações	Pendente a aprovação do Plano de Trabalho; o CBH se encontra com foco no instrumento do enquadramento.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
plano de trabalho definido	2022	0,25	0,25
2 oficinas realizada	2023	0,5	0,25
minuta de resolução apresentada ao órgão gestor	2024	0,75	
resolução publicada	2025	1	

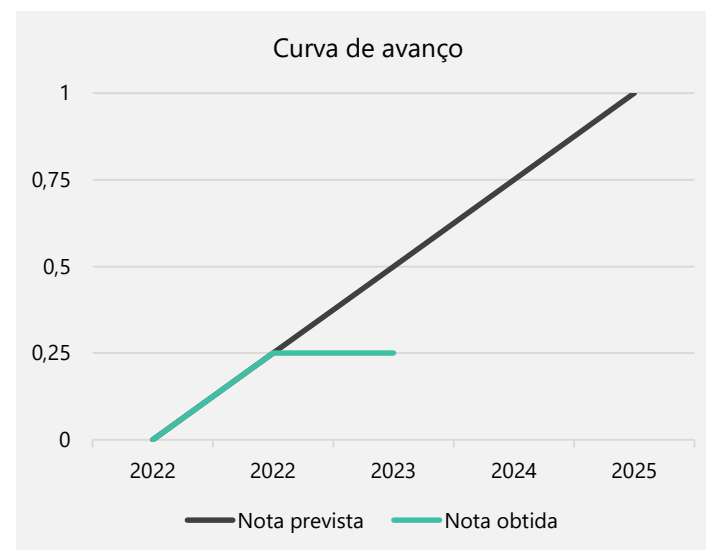


Ação 1.2.1.2 - Acompanhar, por meio de reuniões com os órgãos gestores, as atividades de emissão de outorga para a RH IX

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.1 - Outorga
Meta	Realização de 15 divulgações de dados e informações referentes ao tema outorga na vigência do PBH
Atividades previstas	Solicitar dados ao INEA Realizar tratamento dos dados recebidos Realizar divulgação de dados e informações sobre outorga
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Solicitação de dados ao INEA		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma divulgação realizada	2023	0	0
4 divulgações realizadas	2025	0,25	
8 divulgações realizadas	2029	0,5	
12 divulgações realizadas	2033	0,75	
15 divulgações realizadas	2036	1	

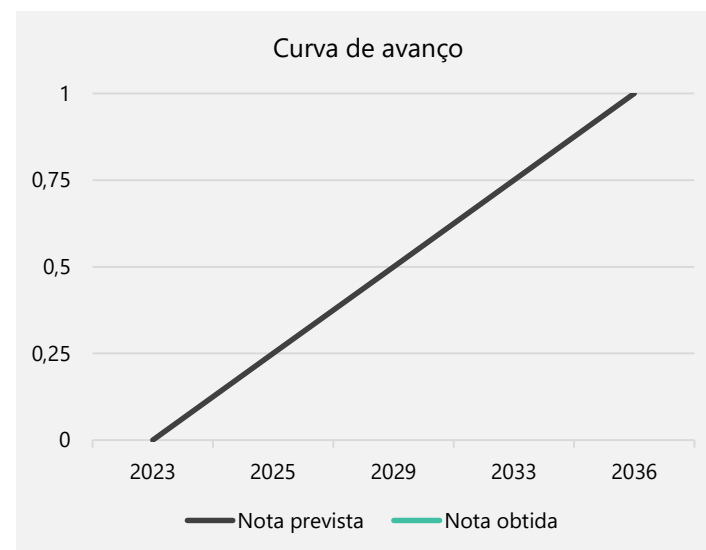


Ação 1.2.2.1 - Discutir as diretrizes definidas para a cobrança no PBH e definir as proposições a serem seguidas para o instrumento na região hidrográfica, em atendimento às metas do Contrato de Gestão

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.2 - Cobrança
Meta	Publicação de resolução sobre as diretrizes para aperfeiçoamento do instrumento da cobrança propostas pelo comitê até o 4º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	Realizar discussões sobre o estudo de impacto dos valores praticados na cobrança sobre os diferentes segmentos de usuários
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,25	Nota alcançada	0,50
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
meta do CG para 2021 cumprida	2022	0,25	0,5
meta do CG para 2022 cumprida	2023	0,5	0,5
minuta de resolução apresentada ao órgão gestor	2024	0,75	
resolução publicada	2025	1	

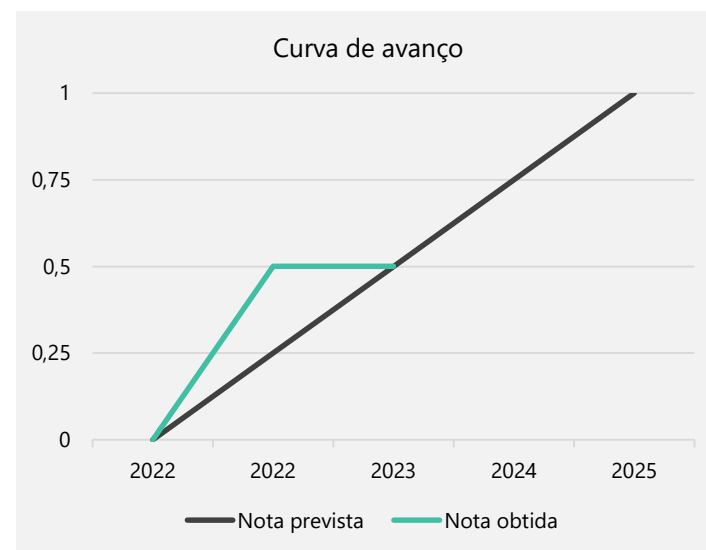


Ação 1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.3 - Enquadramento
Meta	Conclusão do estudo técnico inicial para construção da proposta de enquadramento
Atividades previstas	Participar de reuniões e eventos dos estudos técnicos, bem como fornecer subsídios e dados técnicos
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 1.750.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,75	Nota alcançada	0,75
Atividades executadas	Em andamento - contrato CEIVAP da empresa para os estudos técnicos iniciais Grupo de trabalho criado e reuniões em andamento		
Principais constatações	O contrato para a etapa técnico-propositiva do enquadramento está em andamento e sendo acompanhado pelo CBH-BPSI por meio do Grupo de Trabalho		
Recomendações	-		

Ação 1.2.3.1 - Viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma reunião realizada	2022	0	0
designar técnico da ED para acompanhamento	2022	0,25	0,25
subsidiar o estudo com dados técnicos	2023	0,5	0,5
presença do CBH em 70% dos eventos previstos	2023	0,75	0,75
estudo técnico apresentado ao comitê	2024	1	

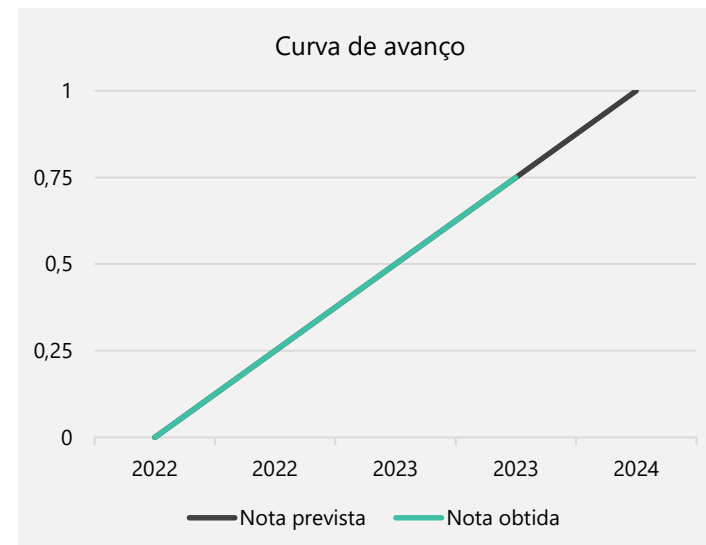


Ação 1.2.3.2 - Elaborar proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.3 - Enquadramento
Meta	Elaboração e aprovação de proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação para a RH VII, entre o 3º e 8º ano de implementação do PBH.
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
plano de trabalho definido	2025	0,25	
2 oficinas realizada	2029	0,5	
minuta de resolução apresentada ao órgão gestor	2033	0,75	
resolução publicada	2036	1	

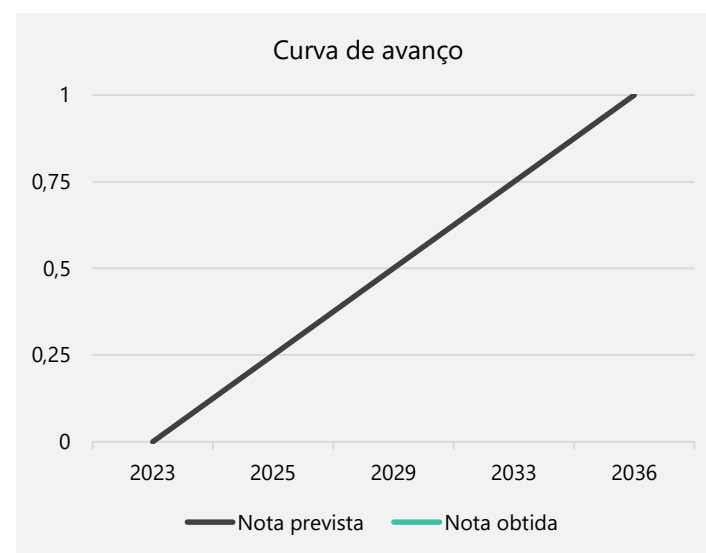


Ação 1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.4 - Plano de Bacia
Meta	Criação e operação do GAP por toda a vigência do PBH, por meio de reuniões semestrais
Atividades previstas	Realizar reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs Elaborar informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs) Divulgar andamento da execução dos PBHs e PDRHs
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Reuniões periódicas de avaliação do andamento dos PBHs e PDRHs; informe do andamento da execução dos PBHs e PDRHs (Ação 1.2.4.3 dos PBHs e PDRHs); divulgação do andamento da execução dos PBHs e PDRHs		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.2.4.1 - Criar e manter o GAP - Grupo de Acompanhamento do Plano

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma reunião realizada	2023	0	0
8 reuniões realizadas	2025	0,25	
16 reuniões realizadas	2029	0,5	
24 reuniões realizadas	2033	0,75	
30 reuniões realizadas	2036	1	

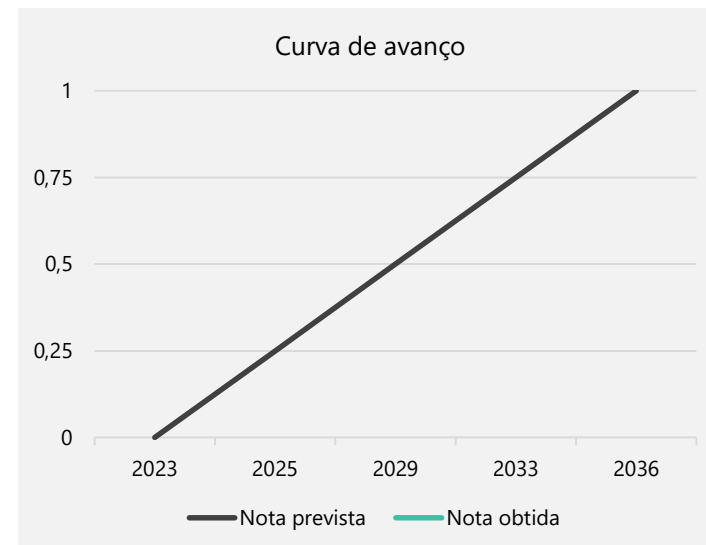


Ação 1.2.4.2 - Realizar atualizações periódicas do orçamento, a cada 5 anos, e atualização completa do Plano de Bacia a partir 12º ano.

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.4 - Plano de Bacia
Meta	Realização de 2 atualizações do orçamento do PBH e 1 atualização completa do PBH, durante o prazo de implementação do PBH (15 anos)
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 1.200.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atualização realizada	2023	0	0
pelo menos 1 atualização do orçamento realizada	2026	0,25	
pelo menos 2 atualizações do orçamento realizadas	2031	0,5	
pelo menos 2 atualizações do orçamento realizadas e revisão completa em andamento	2033	0,75	
pelo menos 2 atualizações do orçamento e 1 atualização do PBH realizadas	2036	1	

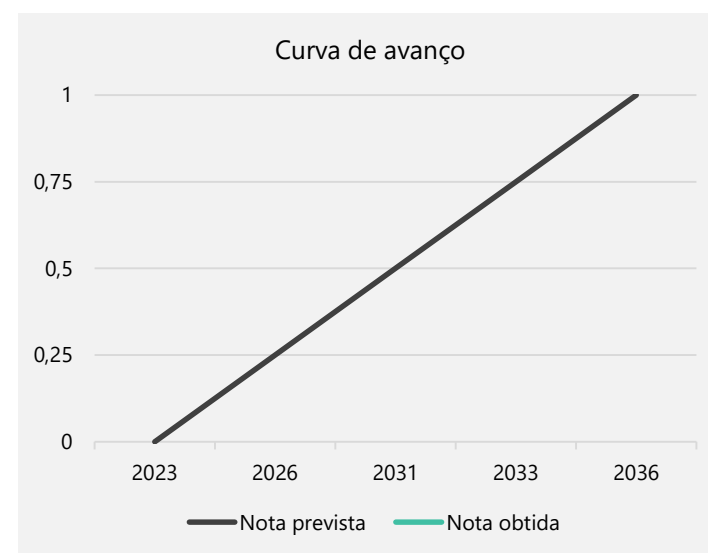


Ação 1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.4 - Plano de Bacia
Meta	Realizar 15 divulgações da situação de implementação do PBH
Atividades previstas	Elaborar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH Apresentar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH na plenária do CBH Divulgar o relatório de situação anual acerca da implementação do PBH
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Elaboração do relatório de situação anual acerca da implementação do PBH, apresentação e divulgação		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.2.4.3 - Divulgar periodicamente a situação de implementação do PBH

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma divulgação realizada	2023	0	0
4 divulgações realizadas	2025	0,25	
8 divulgações realizadas	2029	0,5	
12 divulgações realizadas	2033	0,75	
15 divulgações realizadas	2036	1	

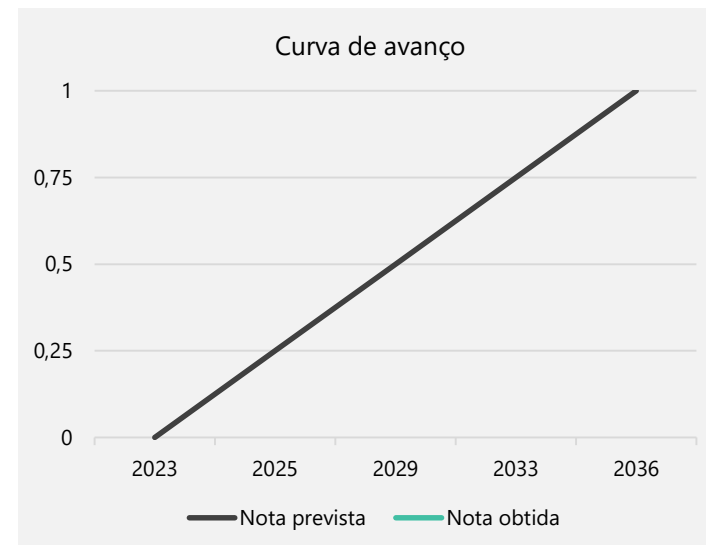


Ação 1.2.4.4 - Complementar as informações de diagnóstico, prognóstico, diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais itens do PBH para a região da bacia do Itabapoana

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.4 - Plano de Bacia
Meta	Complementação das informações do PBH para a região da bacia de Itabapoana entre o 1º e 3º ano de vigência do PBH
Atividades previstas	Realizar a articulação e a pactuação dos atores pertinentes na complementação do PBH RH-IX, porção Itabapoana Elaborar estratégia para o planejamento da porção Itabapoana da RH-IX Implementar e acompanhar a estratégia de planejamento da porção Itabapoana da RH-IX
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 360.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, em atraso		
Nota prevista	0,50	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Articulação e a pactuação dos atores pertinentes na complementação do PBH RH-IX, porção Itabapoana Elaboração de estratégia para o planejamento da porção Itabapoana da RH-IX Acompanhamento da estratégia de planejamento da porção Itabapoana da RH-IX		
Principais constatações	Realização do I Encontro Técnico da porção fluminense da bacia hidrográfica do rio Itabapoana em Bom Jesus do Itabapoana		
Recomendações	-		

Ação 1.2.4.4 - Complementar as informações de diagnóstico, prognóstico, diretrizes para os instrumentos de gestão, programa de ações e demais itens do PBH para a região da bacia do Itabapoana

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
termo de referência concluído	2022	0,25	0
empresa contratada e estudo em elaboração	2023	0,5	0
estudo concluído	2024	0,75	
estudo aprovado em plenária	2024	1	

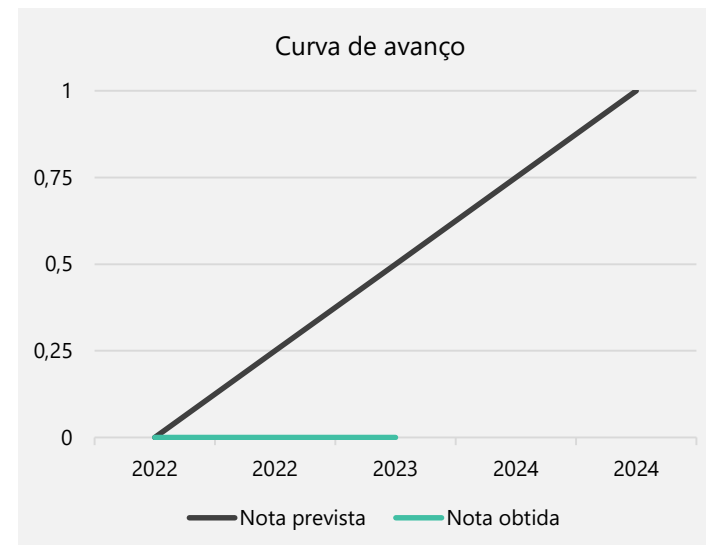


Ação 1.2.4.5 - Definir área das Lagoas da RH IX e elaborar plano de trabalho para o desenvolvimento dos Planos de Manejo de Usos Múltiplos de Lagoa ou Laguna (PMULs), em conjunto com o órgão gestor

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.4 - Plano de Bacia
Meta	Definição do plano de trabalho para elaboração dos PMULs em conjunto com o órgão gestor
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
	Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
	nenhuma atividade realizada	2023	0	0
	2 reuniões realizadas	2025	0,25	
	1 oficina realizada	2025	0,5	
	minuta de plano de trabalho elaborada	2026	0,75	
	plano de trabalho acordado	2026	1	

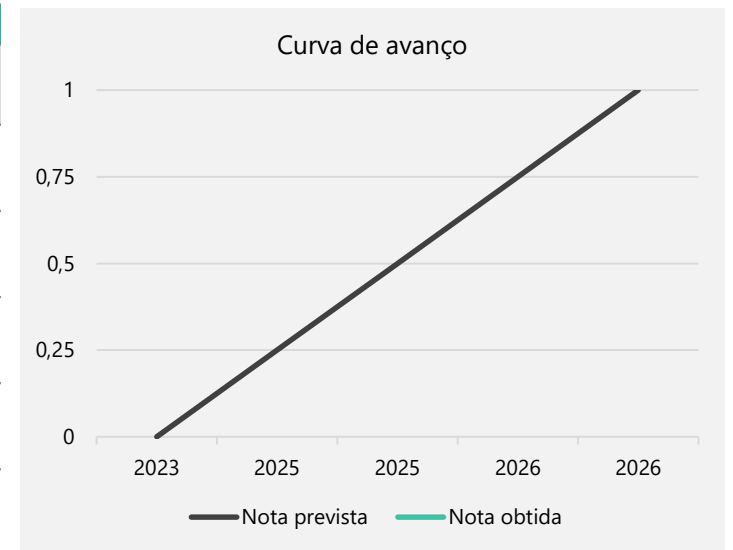


Ação 1.2.4.6 - Desenvolver as propostas de PMULs em conformidade ao plano de trabalho elaborado

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.4 - Plano de Bacia
Meta	Proposta de PMULs elaborada e alinhada com o órgão gestor
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida	
nenhuma atividade realizada	2023	0	0	
1ª reunião relativa às PMULs realizada	2027	0,25		
3ª reunião relativa às PMULs realizadas	2028	0,5		
proposta de PMULs concluída	2029	0,75		
proposta de PMULs alinhada com o órgão gestor	2030	1		

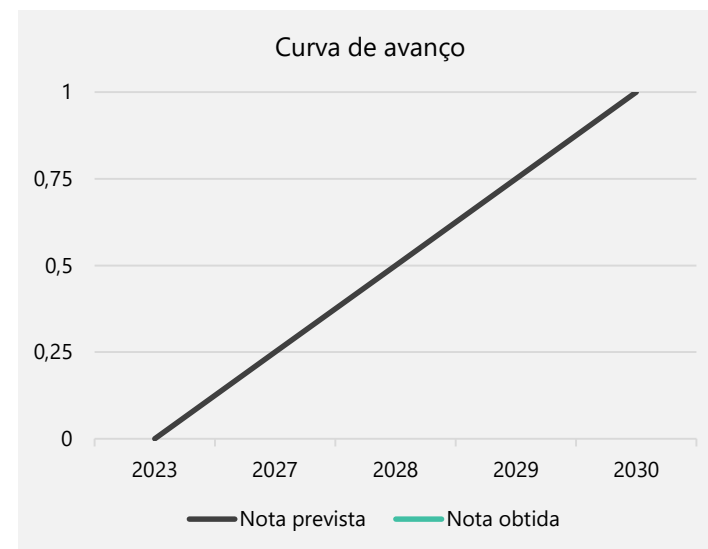


Ação 1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH IX e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.2 - Instrumentos de Gestão
Programa	1.2.5 - Sistema de Informações
Meta	Manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH IX durante a vigência do PBH
Atividades previstas	Encaminhar demandas de manutenção e atualização do SIGA Realizar a manutenção e aperfeiçoamento do SIGA Acompanhar a contratação Apresentar prestação de contas do andamento do contrato nos CBHs
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 600.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Encaminhamento de demandas de manutenção e atualização do SIGA; manutenção e aperfeiçoamento do SIGA; acompanhamento da contratação		
Principais constatações	Foram inseridos shapes referentes à porção do Itabapoana no SIGA-BPSI		
Recomendações	-		

Ação 1.2.5.1 - Realizar a manutenção e atualização do Sistema de Informações da RH IX e as suas melhorias baseadas nas diretrizes do PBH

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
sistema sem funcionamento	2023	0	0
sistema em funcionamento durante quarto anos	2025	0,25	
sistema em funcionamento durante oito anos	2029	0,5	
sistema em funcionamento durante doze anos	2033	0,75	
sistema em funcionamento em todos anos da vigência do PBH	2036	1	

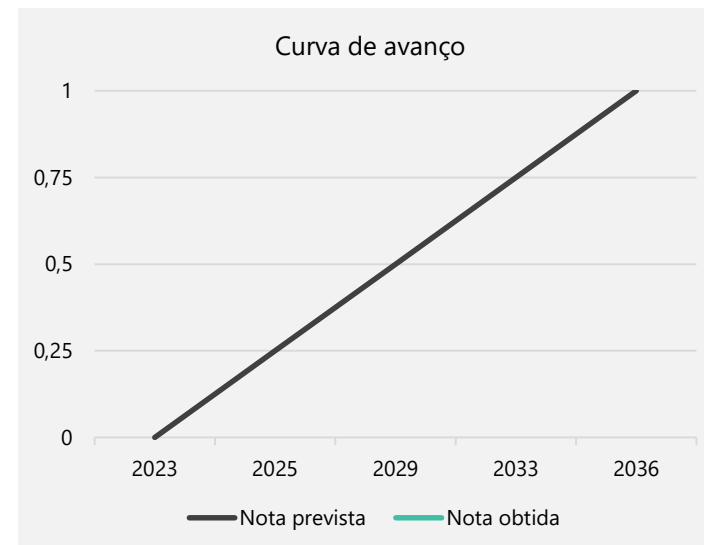


Ação 1.3.1.1 - Estudar, pactuar e propor a criação de Unidades Especiais de Gestão (UEGs) e definir as necessidades de manejo diferenciado e possíveis restrições de uso

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.3 - Unidades Especiais de Gestão (UEGs)
Programa	1.3.1 - Criação de UEGs e Indicação de Manejos Diferenciados
Meta	Realização de Estudo e proposição de UEGs entre o 3º e 8º ano de vigência do PBH.
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
plano de trabalho definido	2024	0,25	
2 oficinas realizadas	2025	0,5	
proposta de UEGs concluída	2027	0,75	
proposta de UEGs alinhada com o órgão gestor e aprovada	2029	1	

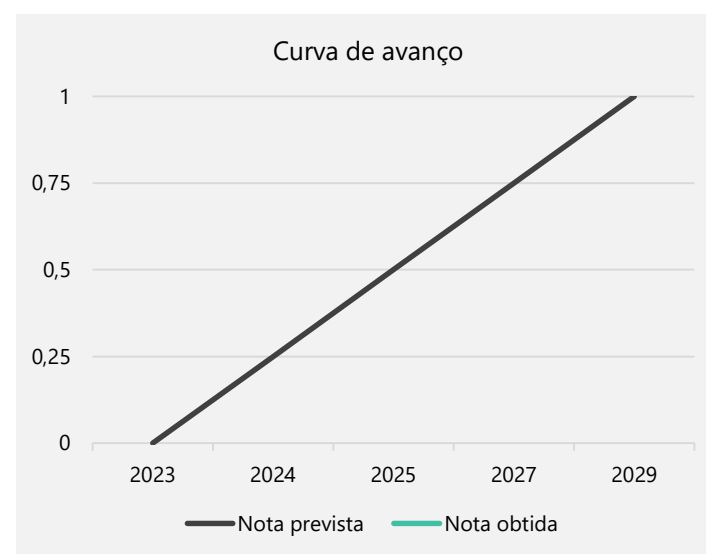


Ação 1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.4 - Eventos Críticos
Programa	1.4.1 - Plano de Gerenciamento de Risco
Meta	Divulgação do Plano de Gerenciamento de Riscos aos órgãos pertinentes de sua área de atuação
Atividades previstas	Participar de reuniões, eventos e contribuir na elaboração do PGR da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 878.404,03

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Participação em reuniões, eventos e contribuição na elaboração do PGR da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 1.4.1.1 - Viabilizar relatório sobre eventos críticos para divulgação aos órgãos pertinentes com base no Plano de Gerenciamento de Riscos da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
1 oficina realizada	2024	0,25	
1 reunião realizada	2025	0,5	
proposta de divulgação elaborada	2025	0,75	
divulgação realizada	2026	1	

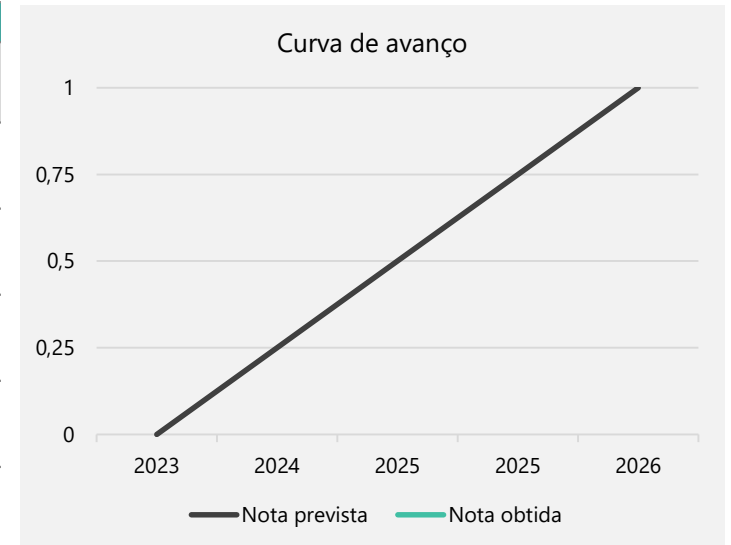


Ação 1.4.2.1 - Ações emergenciais para eventos críticos em recursos hídricos

Ação	
Agenda	1 - Gestão de Recursos Hídricos
Subagenda	1.4 - Eventos Críticos
Programa	1.4.2 - Ações emergenciais
Meta	-
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida	
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			




Ação 2.1.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quali-quantitativo da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.1 - Água Superficial
Programa	2.1.1 - Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-quantitativo
Meta	Levantamento das informações sobre os problemas de balanço hídrico para subsídio do estudo da ação 2.1.1.1 do PIRH, entre o 5º e 9º ano de implementação do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 2.950.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
1 oficina realizada	2026	0,25	
1 reunião realizada	2027	0,5	
consolidação do resultado da oficina e das reuniões	2028	0,75	
formalização das informações	2030	1	

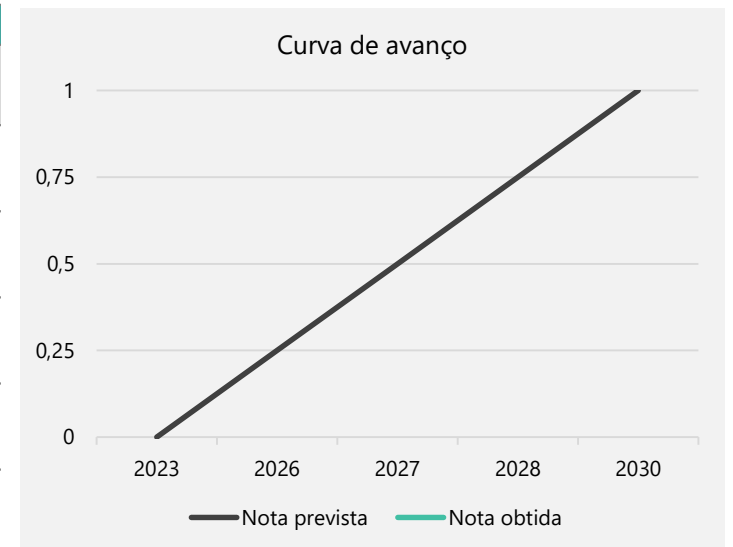


Ação 2.1.1.2 - Realizar estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quantitativo e proposição de soluções com foco na bacia hidrográfica do rio Macabu, incluindo elaboração de Manual Operativo do sistema

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.1 - Água Superficial
Programa	2.1.1 - Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-quantitativo
Meta	Realização de estudo de equacionamento de problemas de balanço hídrico quantitativo entre o 4º e 5º ano de vigência do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 150.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
termo de referência concluído	2025	0,25	
empresa contratada e estudo em elaboração	2025	0,5	
estudo concluído	2026	0,75	
estudo apresentado ao comitê	2026	1	

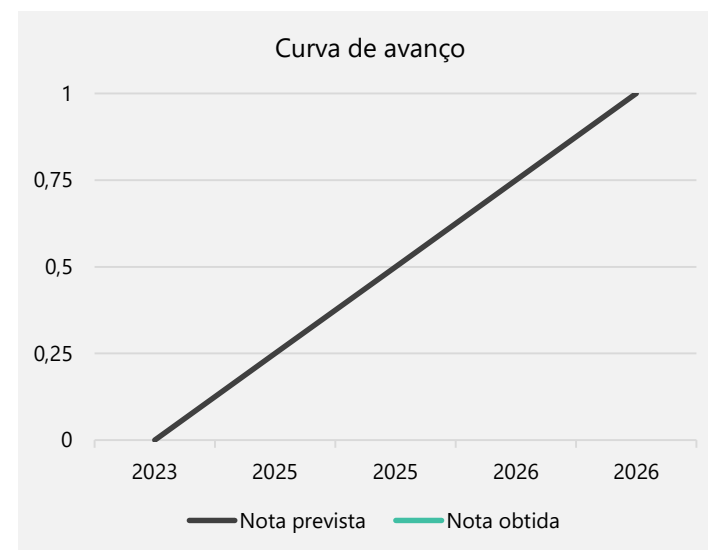


Ação 2.1.1.3 - Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas regiões afetadas

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.1 - Água Superficial
Programa	2.1.1 - Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-quantitativo
Meta	Realização de estudo de mapeamento atualizado e definição de diretrizes para controle dos efeitos da salinização entre o 2º e 4º ano de vigência do PBH
Atividades previstas	Discutir o escopo do estudo a ser contratado Propor diretrizes para especificações do TR Elaborar o termo de referência Contratar a empresa para elaboração do estudo
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 150.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, em atraso		
Nota prevista	0,50	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Articulação com CNPq para possível Edital de Pesquisa na temática		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 2.1.1.3 - Realizar estudo e definir diretrizes para controle dos efeitos da salinização nas regiões afetadas

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
termo de referência concluído	2023	0,25	0
empresa contratada e estudo em elaboração	2023	0,5	0
estudo concluído	2024	0,75	
estudo apresentado ao comitê	2025	1	

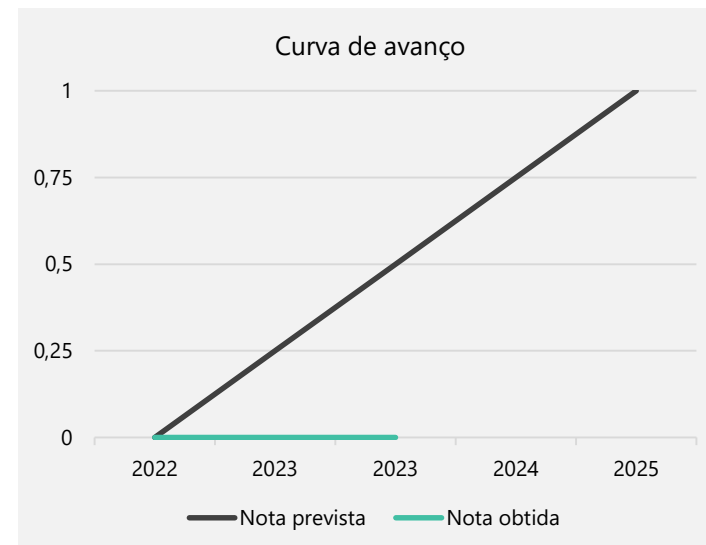


Ação 2.1.1.4 - Subsidiar os estudos sobre os canais da baixada campista

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.1 - Água Superficial
Programa	2.1.1 - Equacionamento de Problemas de Balanço Hídrico Quali-quantitativo
Meta	Levantamento de informações, com base em dados secundários, sobre os canais da baixada campista para subsídio do estudo da ação 2.1.1.3 do PIRH entre o 1º e 3º ano de vigência do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0,75	Nota alcançada	1,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 2.1.1.4 - Subsidiar os estudos sobre os canais da baixada campista

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
1ª reunião realizada	2022	0,25	1
2ª reunião realizada	2023	0,5	1
consolidação do resultado da oficina e das reuniões	2023	0,75	1
formalização das informações	2024	1	

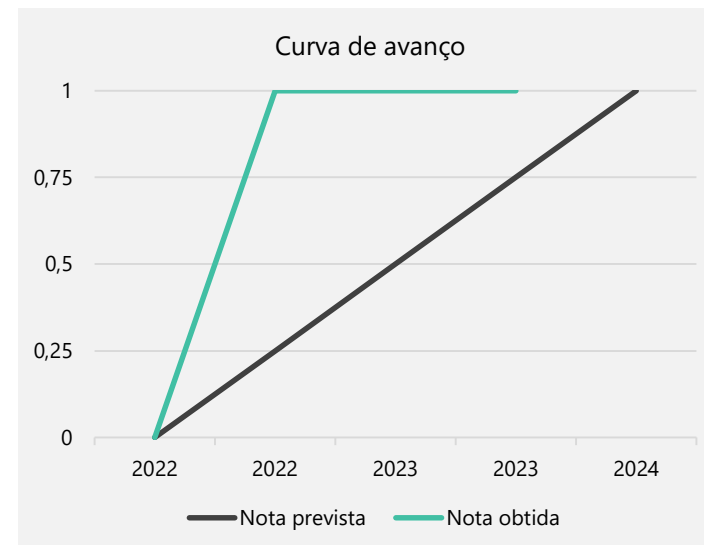


Ação 2.2.1.1 - Subsidiar a elaboração do estudo sobre a água subterrânea na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.2 - Água Subterrânea
Programa	2.2.1 - Uso Sustentável da Água Subterrânea
Meta	Levantamento de informações, com base em dados secundários, sobre os problemas de balanço hídrico para subsídio do estudo da ação 2.2.1.1 do PIRH entre o 6º e 9 ano do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 2.680.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
1ª reunião realizada	2027	0,25	
2ª reunião realizada	2027	0,5	
consolidação do resultado da oficina e das reuniões	2028	0,75	
formalização das informações	2030	1	

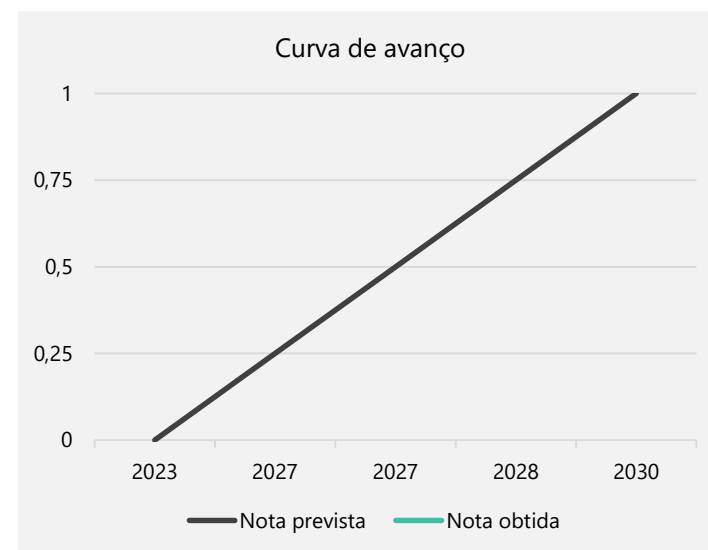


Ação 2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial
Programa	2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente
Meta	Oficialização, 5 vezes, aos órgãos mantenedores das redes de monitoramento existente quanto a situação da operação do monitoramento quantitativo da água superficial, durante a vigência do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 2.3.1.1 - Acompanhar a operação realizada pelo órgão responsável na rede de monitoramento existente

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum ofício encaminhado	2023	0	0
1º ofício encaminhado	2025	0,25	
2º ofício encaminhado	2029	0,5	
3º ofício encaminhado	2033	0,75	
5º ofício encaminhado	2036	1	

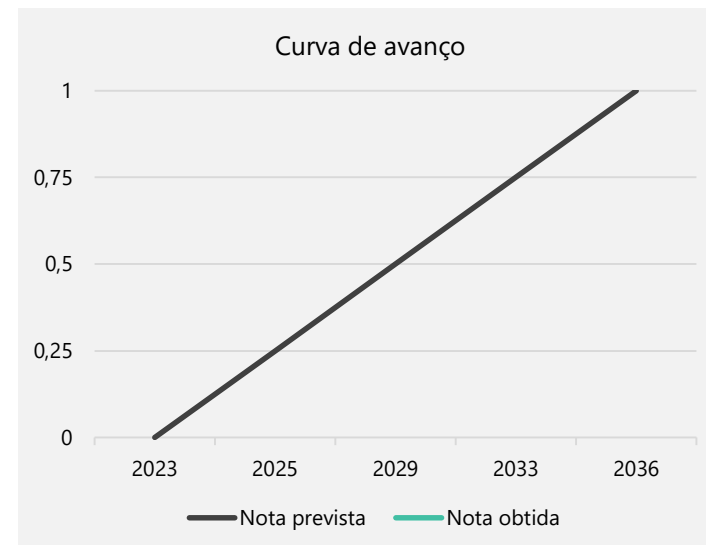


Ação 2.3.1.2 - Realizar a operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativa existente sob responsabilidade do comitê

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial
Programa	2.3.1 - Operação e Manutenção da Rede de Monitoramento Quali-quantitativa existente
Meta	Mantimento do funcionamento da rede de monitoramento quali-quantitativa existente sob responsabilidade do comitê pela vigência do PBH
Atividades previstas	Manter a Sala de Monitoramento em funcionamento
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 150.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Sala de Monitoramento em funcionamento		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
rede sem funcionamento	2023	0	0
rede de monitoramento em funcionamento durante quatro anos	2025	0,25	
rede de monitoramento em funcionamento durante oito anos	2029	0,5	
rede de monitoramento em funcionamento durante doze anos	2033	0,75	
rede de monitoramento em funcionamento em todos os anos de vigência do PBH	2036	1	

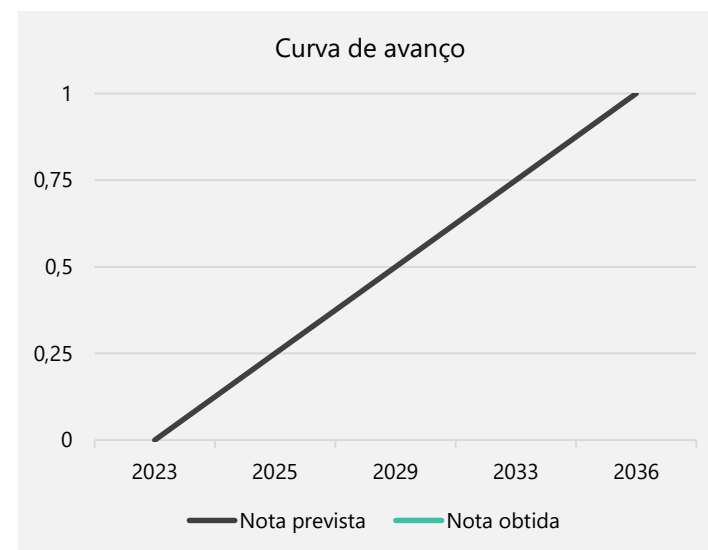


Ação 2.3.2.1 - Elaborar estudo de avaliação da situação atual com vistas ao redimensionamento da rede de monitoramento da quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea na RH IX

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial
Programa	2.3.2 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa
Meta	Realização de estudo de avaliação da rede de monitoramento entre o 4º e 5º ano de vigência do PBH.
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
termo de referência concluído	2025	0,25	
empresa contratada e estudo em elaboração	2025	0,5	
estudo concluído	2026	0,75	
estudo apresentado ao comitê	2026	1	

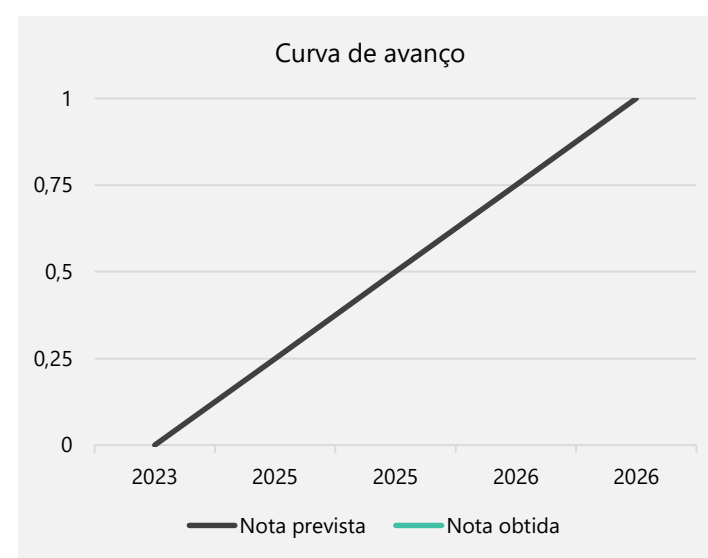


Ação 2.3.2.2 - Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI

Ação	
Agenda	2 - Recursos Hídricos Quali-quantitativo
Subagenda	2.3 - Monitoramento Quali-quantitativo da água superficial
Programa	2.3.2 - Melhoria, redimensionamento e modernização da rede de monitoramento quali-quantitativa
Meta	Realização ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento
Atividades previstas	Realizar reuniões para discutir ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento Contratação de execução de projeto executivo - Automatização de leitura de cotas Medição de vazão e elaboração de curvas-chave (interface com linha de pesquisa) Aquisição de drone Reforma da sala
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 240.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,50	Nota alcançada	0,75
Atividades executadas	Discussão de ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento Em andamento - Contratação de projeto executivo - Automatização de leitura de cotas Em andamento - Medição de vazão e elaboração de curvas-chave (interface com linha de pesquisa) Concluído - Aquisição de drone Em andamento - Reforma da sala		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 2.3.2.2 - Realizar as ações e aperfeiçoamentos previstos na Sala de Monitoramento do BPSI

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
1 reunião realizada	2022	0,25	0,5
plano de trabalho acordado	2023	0,5	0,75
execução das ações previstas	2024	0,75	
elaboração de relatório das atividades	2025	1	

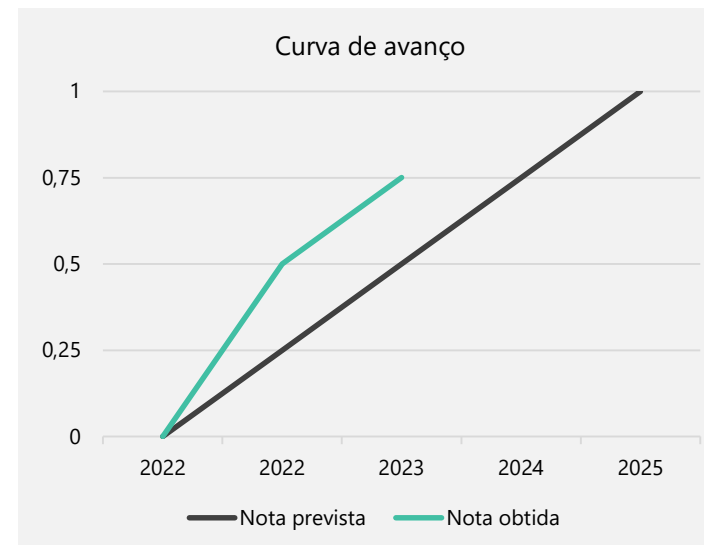


Ação 3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário

Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.1 - Esgotamento Sanitário
Programa	3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário
Meta	Assinatura de 5 acordos de cooperação técnica com os municípios hierarquizados para elaboração de estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário
Atividades previstas	Acompanhar - SES Itaperuna (CIDENNF) Assinar Contrato de Transferência para contratação direta - SES Varre-sai Acompanhar - SES Varre-sai Contratar - SES Laje do Muriaé Acompanhar - SES Laje do Muriaé Contratar gerenciadora para acompanhamento dos projetos contratados
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 6.108.043,38

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,50
Atividades executadas	Acompanhamento - SES Itaperuna (CIDENNF) Contratação - SES Laje do Muriaé Acompanhamento - SES Laje do Muriaé Contratação de gerenciadora para acompanhamento dos projetos contratados		
Principais constatações	Acordos assinados com os municípios de Itaperuna e Laje do Muriaé. Não foi possível a assinatura do Contrato de Transferência com o CIDENNF para o SES de Varre-Sai, pois o Consórcio aguarda o desenrolar do SES Itaperuna para verificar a viabilidade de acompanhamento de outro projeto.		
Recomendações	-		

Ação 3.1.1.1 - Elaborar estudos, projetos básicos e projetos executivos de sistema de esgotamento sanitário

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum estudo ou projeto realizado	2023	0	0,5
1 estudo ou projeto realizado	2025	0,25	
2 estudos ou projetos realizados	2029	0,5	
3 estudos ou projetos realizados	2033	0,75	
5 estudos ou projetos realizados	2036	1	

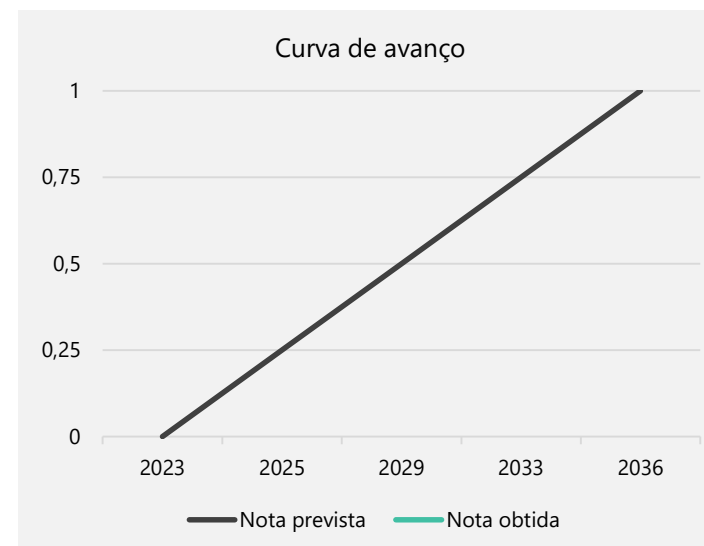


Ação 3.1.1.2 - Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário

Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.1 - Esgotamento Sanitário
Programa	3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário
Meta	Assinatura de 5 acordos de cooperação técnica com os municípios hierarquizados para elaboração de estudos, projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário
Atividades previstas	Discussão sobre Edital a ser lançado para hierarquização de projetos de esgotamento sanitário rural Assinar acordo de cooperação técnica com os municípios selecionados e hierarquizados
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 2.271.318,24

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Criação de Grupo de Trabalho de Saneamento para discussão das ações		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 3.1.1.2 - Executar projetos básicos e executivos de sistema de esgotamento sanitário

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum estudo ou projeto realizado	2023	0	0
1 estudo ou projeto realizado	2025	0,25	
2 estudos ou projetos realizados	2029	0,5	
3 estudos ou projetos realizados	2033	0,75	
5 estudos ou projetos realizados	2036	1	

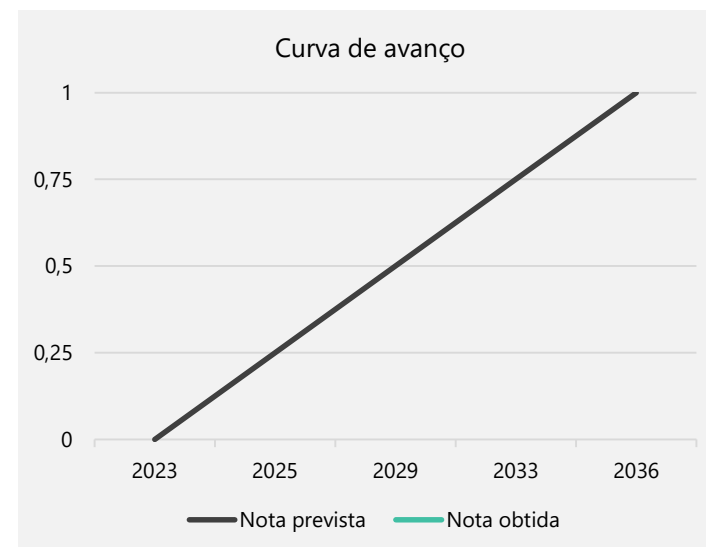


Ação 3.1.1.3 - Apoiar e oferecer contrapartida financeira na execução de projetos de esgotamento sanitário (nesta ação se inserem as contrapartidas realizadas no Edital Protratar do CEIVAP)

Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.1 - Esgotamento Sanitário
Programa	3.1.1 - Ampliação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Esgotamento Sanitário
Meta	Emissão de carta de contrapartida a 3 municípios ao longo da vigência do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 3.021.257,81

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	Não houve inscrições de municípios da RH-IV para contrapartida.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma carta emitida	2023	0	0
1 carta emitida	2035	0,25	
2 cartas emitidas	2035	0,5	
2 cartas emitidas	2036	0,75	
3 cartas emitidas	2036	1	

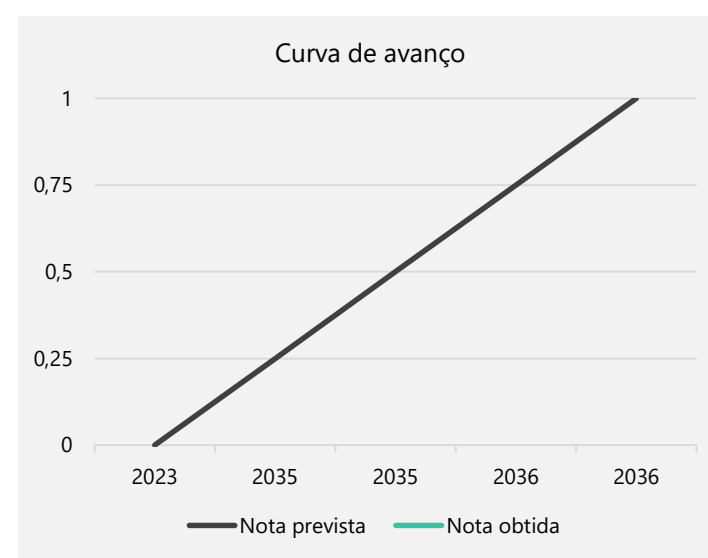


Ação 3.2.1.1 - Viabilizar relatório sobre resíduos sólidos para divulgação aos órgãos pertinentes

Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.2 - Resíduos Sólidos
Programa	3.2.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento das Áreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos
Meta	Divulgação de informações com base no estudo realizado no âmbito do PIRH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 4.460.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
	Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
	nenhuma atividade realizada	2023	0	0
	1 oficina realizada	2031	0,25	
	1 reunião realizada	2032	0,5	
	proposta de divulgação elaborada	2032	0,75	
	divulgação realizada	2033	1	

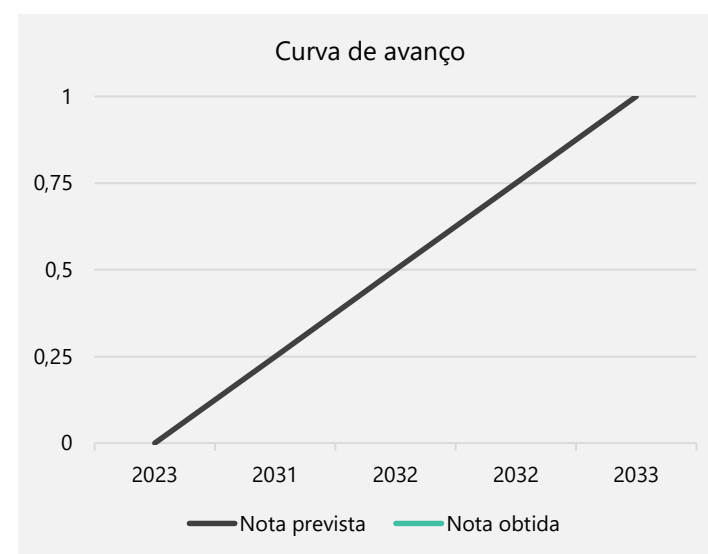


Ação 3.3.1.1 - Viabilizar relatório sobre drenagem urbana para divulgação aos órgãos pertinentes

Ação	
Agenda	3 - Saneamento Urbano e Rural
Subagenda	3.3 - Drenagem Urbana
Programa	3.3.1 - Ampliação e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Drenagem Urbana
Meta	Divulgação de informações com base no levantamento realizado no âmbito do PIRH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 1.475.000,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho				
	Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
	nenhuma atividade realizada	2023	0	0
	1 oficina realizada	2035	0,25	
	1 reunião realizada	2035	0,5	
	proposta de divulgação elaborada	2036	0,75	
	divulgação realizada	2036	1	

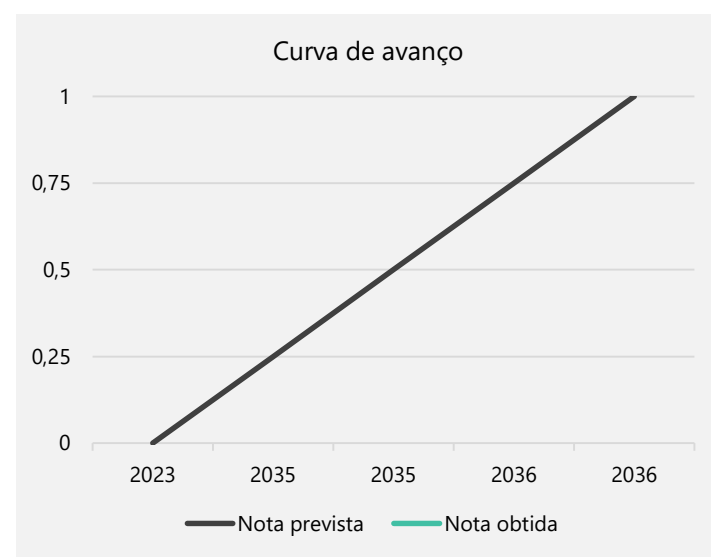


Ação 4.1.1.1 - Formalizar a indicação de bacias hidrográficas prioritárias para elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos

Ação	
Agenda	4 - Infraestrutura verde
Subagenda	4.1 - Planejamento Territorial
Programa	4.1.1 - Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias
Meta	Formalização das bacias hidrográficas prioritárias
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	1,00	Nota alcançada	1,00
Atividades executadas	-		
Principais	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2022	0	0
1ª reunião realizada	2022	0,25	0,5
2ª reunião realizada	2022	0,5	1
proposta de formalização elaborada	2023	0,75	1
formalização realizada	2023	1	1

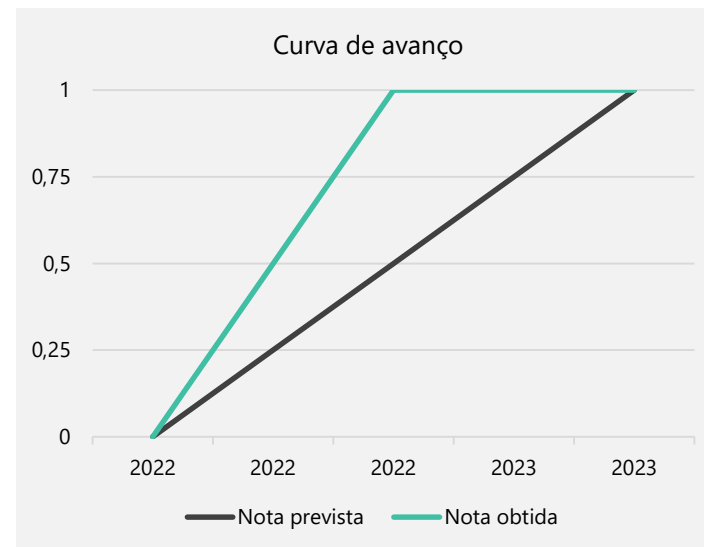


Ação 4.1.1.2 - Viabilizar a elaboração de estudos, planos e projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à preservação dos recursos hídricos

Ação	
Agenda	4 - Infraestrutura verde
Subagenda	4.1 - Planejamento Territorial
Programa	4.1.1 - Elaboração de Estudos e Projetos de Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias
Meta	Desenvolvimento de 1 estudo, plano ou projeto com vistas à recuperação ambiental e ao manejo correto do solo voltados a preservação dos recursos hídricos
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 3.440.000,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	1,00
Atividades executadas	Conclusão da elaboração dos projetos no contexto do Mananciais		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	1
elaboração de TDR	2024	0,25	
projeto contratado	2027	0,5	
projeto em andamento	2030	0,75	
projeto finalizado	2033	1	

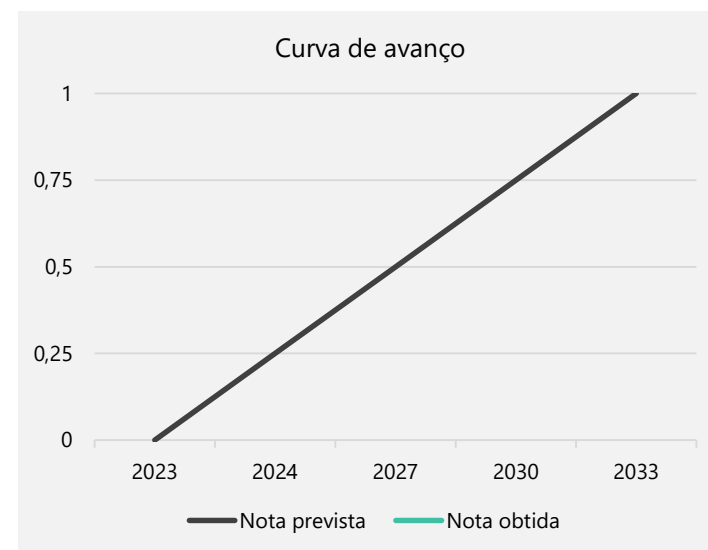


Ação 4.1.2.1 - Identificar, mobilizar e formalizar acordos e parcerias com vistas à execução de ações de recuperação ambiental e manejo do solo

Ação	
Agenda	4 - Infraestrutura verde
Subagenda	4.1 - Planejamento Territorial
Programa	4.1.2 - Mobilização Social visando à Conservação e Reabilitação de Bacias Hidrográficas Prioritárias
Meta	Formalização de 1 acordo de cooperação técnica com instituições estratégicas durante a vigência do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	1,00
Atividades executadas	Conclusão da elaboração dos projetos no contexto do Mananciais		
Principais constatações	Atividades realizadas no âmbito do Mananciais.		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum acordo realizado	2023	0	1
1ª reunião realizada	2025	0,25	
2ª reunião realizada	2029	0,5	
elaboração do acordo	2033	0,75	
acordo realizado	2036	1	

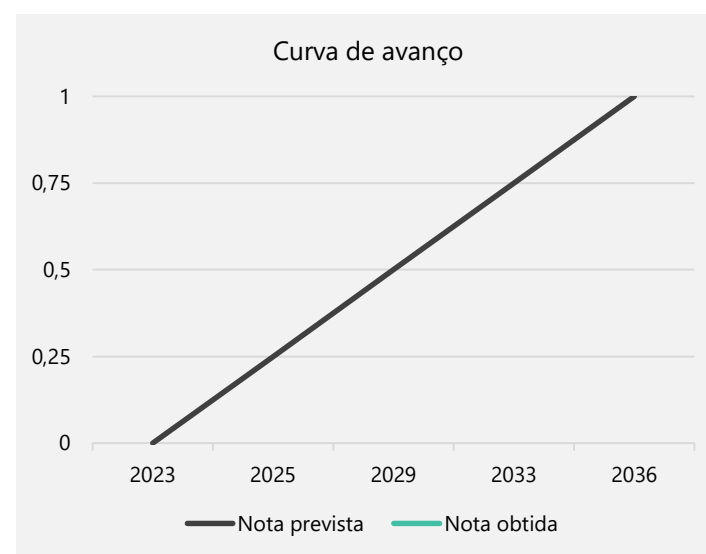


Ação 4.2.1.1 - Executar projetos com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos

Ação	
Agenda	4 - Infraestrutura verde
Subagenda	4.2 - Intervenções na Paisagem
Programa	4.2.1 - Restauração e Conservação de Bacias Hidrográficas e reabilitação de corpos hídricos
Meta	Execução de 1 projeto com vistas à recuperação ambiental voltada à conservação dos recursos hídricos
Atividades previstas	Acompanhar as ações estruturais Participar das ações estruturais
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 90.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,50	Nota alcançada	0,75
Atividades executadas	Acompanhamento das ações estruturais Participação nas ações estruturais		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum projeto executado	2022	0	0
elaboração de TDR	2022	0,25	0,25
projeto contratado	2023	0,5	0,75
projeto em andamento	2024	0,75	
projeto finalizado	2024	1	

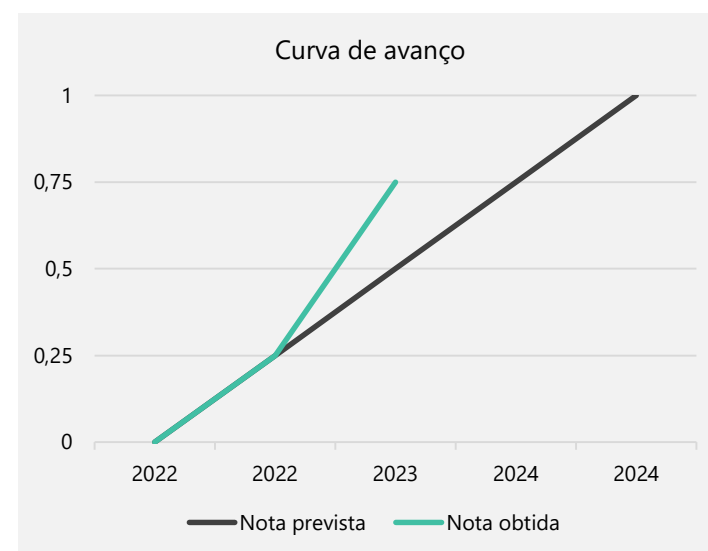


Ação 5.1.1.1 - Oferecer apoio financeiro à produção do conhecimento técnico e científico em recursos hídricos

Ação	
Agenda	5 - Produção de conhecimento
Subagenda	5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico
Programa	5.1.1 - Produção do Conhecimento Científico, Pesquisa e Extensão
Meta	Formalização de 5 instrumentos na vigência do PBH
Atividades previstas	Assinar Convênio PROPESQUISA RH-IX Acompanhar Convênio PROPESQUISA RH-IX
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 330.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Em andamento - Articulação com entidades de apoio à pesquisa para Convênio		
Principais constatações	Até a presente data, não foi possível a assinatura do Convênio com a instituição vencedora, por falta de retorno da instituição		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum instrumento formalizado	2023	0	0
1 instrumento formalizado	2025	0,25	
3 instrumentos formalizados	2029	0,5	
4 instrumentos formalizados	2033	0,75	
5 instrumentos formalizados	2036	1	

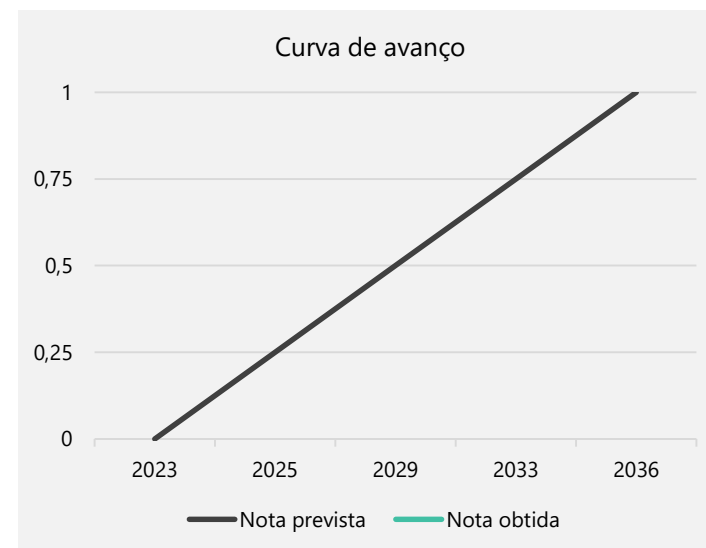


Ação 5.1.2.1 - Realizar estudo sobre o recuo da linha de costa na região de Atafona

Ação	
Agenda	5 - Produção de conhecimento
Subagenda	5.1 - Produção do Conhecimento Técnico e Científico
Programa	5.1.2 - Elaboração de Estudos Técnicos
Meta	Realização do estudo sobre o recuo da linha de costa na região do Atafona entre o 4º e 6º ano de vigência do PBH
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Não iniciada, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma atividade realizada	2023	0	0
termo de referência concluído	2025	0,25	
empresa contratada e estudo em elaboração	2026	0,5	
estudo concluído	2027	0,75	
estudo apresentado ao comitê	2027	1	

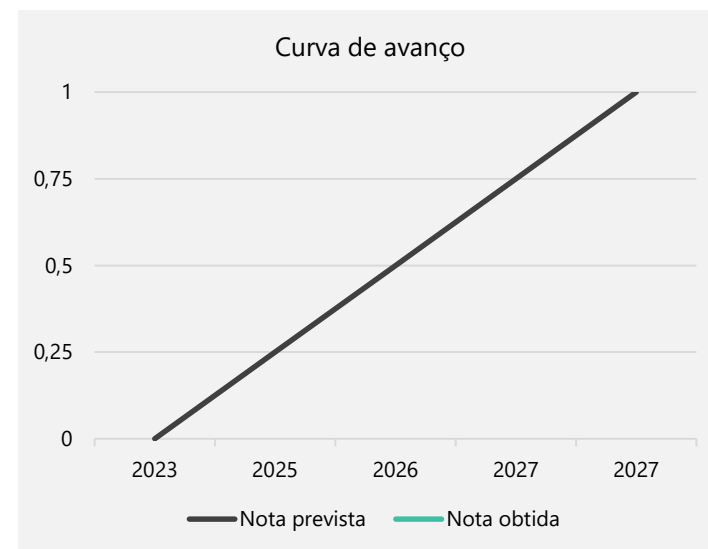


Ação 6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação

Ação	
Agenda	6 - Comunicação e Educação Ambiental
Subagenda	6.1 - Comunicação
Programa	6.1.1 - Gestão de Comunicação
Meta	Execução de 70% das atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação
Atividades previstas	Executar as atividades previstas no Plano de Ações de Comunicação Elaborar relatório contendo comprovação da execução das atividades Apresentar relatório na plenária do CBH
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 225.000,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Atividades executadas conforme Plano de Ações		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Ação 6.1.1.2 - Executar ações de comunicação, incluindo as definidas no Plano de Ações de Comunicação

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhum relatório entregue	2023	0	0
4 relatórios entregues	2025	0,25	
8 relatórios entregues	2029	0,5	
12 relatórios entregues	2033	0,75	
15 relatórios entregues	2036	1	

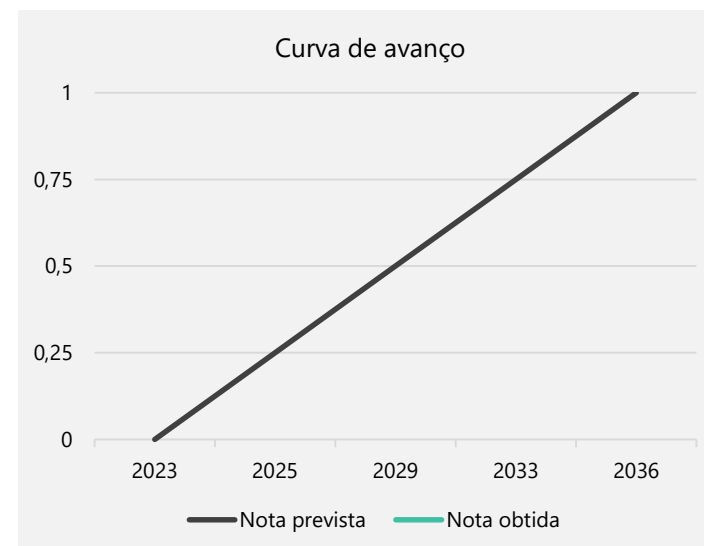


Ação 6.1.1.1 - Realizar a revisão do Plano de Ações de Comunicação

Ação	
Agenda	6 - Comunicação e Educação Ambiental
Subagenda	6.1 - Comunicação
Programa	6.1.1 - Gestão de Comunicação
Meta	Realização de 8 revisões do Plano de Ações de Comunicação
Atividades previstas	-
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 0,00

Resultados			
Status da execução	Concluída		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	-		
Principais constatações	-		
Recomendações	-		

Indicador de desempenho			
Marco	Data prevista	Nota prevista	Nota obtida
nenhuma revisão realizada	2023	0	0
2ª revisão realizada	2025	0,25	
4ª revisão realizada	2029	0,5	
6ª revisão realizada	2033	0,75	
8ª revisão em andamento	2036	1	

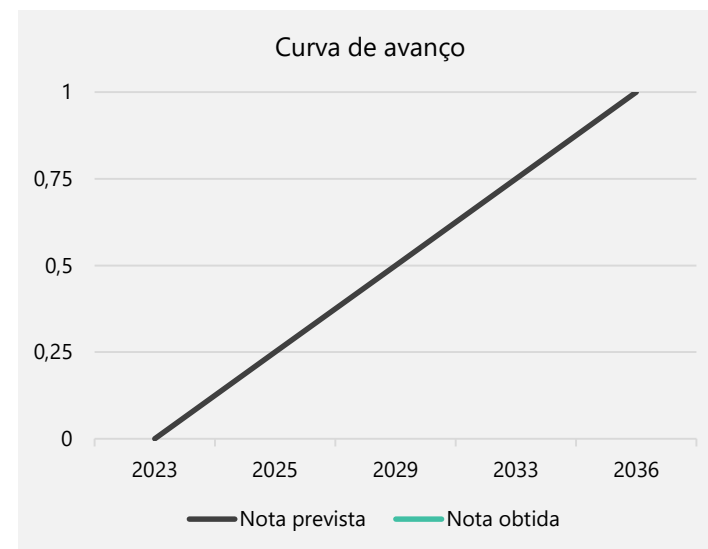

Ação 6.2.1.1 - Promover mobilização social e educação ambiental com foco em gestão de recursos hídricos

Ação	
Agenda	6 - Comunicação e Educação Ambiental
Subagenda	6.2 - Educação Ambiental
Programa	6.2.1 - Educação Ambiental
Meta	Realização de 15 ações de educação ambiental
Atividades previstas	Mobilizar e organizar ações de educação ambiental Realizar ações de educação ambiental Contratação de empresa para elaboração de cartilhas educativas e elaboração de vídeos institucionais pela equipe de comunicação
Prazo para as atividades	Ano do exercício
Responsáveis	CBH; AGEVAP
Custo estimado	R\$ 150.000,00

Resultados			
Status da execução	Em execução, no prazo		
Nota prevista	0,00	Nota alcançada	0,00
Atividades executadas	Mobilização das prefeituras para ações de educação ambiental		
Principais constatações	Realização do Simpósio, em interface com a ação 1.1.2.2 Realizar capacitação dos membros do CBH e da sociedade em geral, quando couber, com foco em gestão de recursos hídricos		
Recomendações	-		
